



**Municipalidad de Tandil**  
2021

**Decreto**

**Número:**

**Referencia:** EX-2021-038436-MUNITAN-DCS#SEA (Lic Públ. 12-01-21)

---

**VISTO:**

Que por el presente se tramita el llamado a Licitación Pública 12-01-21, "Pavimentación en Hormigón dos cuadras en María Ignacia Vela y Gardey (II Etapa) y Mejoramiento urbano, construcción de veredas en Plaza María Ignacia Vela" .

**CONSIDERANDO:**

Que al respecto se ha expedido el Director de Compras y Suministros.

**Por todo ello, en uso de sus facultades**

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TANDIL**

**D E C R E T A**

**Artículo 1°:** Llámase a Licitación Pública 12-01-21, "Pavimentación en Hormigón dos cuadras en María Ignacia Vela y Gardey (II Etapa) y Mejoramiento urbano, construcción de veredas en Plaza María Ignacia Vela", con un presupuesto oficial de Pesos trece millones novecientos cuarenta y dos mil quinientos cincuenta (\$ 13.942.550,00).

**Artículo 2°:** El acto de apertura de las ofertas tendrá lugar en la Dirección de Compras y Suministros, el 7 de julio de 2021, a las 10:00 hs.

**Artículo 3°:** El presente decreto será refrendado por el Secretario de Economía y Administración.

**Artículo 4°:** Regístrese, comuníquese, pase a la Secretaría de Economía y Administración, Dirección de Compras y Suministros, Contaduría General y pase a Guarda Temporal.

## LICITACIÓN PÚBLICA 12-01-21

### **“PAVIMENTACION EN HORMIGON DOS CUADRAS EN M.I. VELA Y GARDEY (II ETAPA) Y MEJORAMIENTO URBANO, CONSTRUCCION DE VEREDAS EN PLAZA M.I. VELA”**

**Monto oficial: \$ 13.942.550,00**

Fecha de Apertura: la determinada por el decreto que autoriza al presente  
llamado.

Lugar de Apertura: Dirección de Compras y Suministros

Valor del Pliego: SIN COSTO

Plazo de ejecución:

- Pavimento: 30 días corridos.
- Plaza: 60 días corridos.

## **MEMORIA DESCRIPTIVA**

La Municipalidad de Tandil en el marco de concretar una nueva pavimentación, licita por este medio, la intervención en las localidades de Gardey y de M-I.Vela respectivamente, ambas localidades del Partido de Tandil, beneficiando en este caso a vecinos frentistas en forma directa y distintos vecinos que por una u otra razón utilizan la cuadra que se planea intervenir.

En el mismo sentido, y con la intención de valorizar un espacio verde de carácter histórico, se propone la construcción de veredas perimetrales e internas en la Plaza Maria Ignacia Vela.

Para ello se ha decidido el presente llamado a Licitación Pública de obra, para cumplir con el objeto de la contratación se deberá tener en cuenta la provisión de mano de obra, materiales y los equipos viales necesarios para la culminación de la obra en tiempo y forma.

La contratación se realizara bajo la modalidad de **Unidad de Medida el pavimento de las calles y Ajuste Alzado las veredas de la plaza**. Las cantidades indicadas en los planos y planillas de cómputos, son a modo indicativos, de forma tal de obtener un cómputo y presupuesto de la obra, con el objeto que las Empresas oferentes puedan realizar sus correspondientes cómputos y posterior oferta, siguiendo las pautas técnicas mencionadas para una correcta y definitiva ejecución de la obra objeto de esta Licitación.

### Listado de cuadras a pavimentar

COMPUTO 2 CUADRAS A PAVIMENTAR					
Calle	entre	y	Con o sin C,C	Cant. de cuadras	Superficie
<b>Localidad: GARDEY</b>					
GUGLIERI	Av. Independencia	Calle 15	c/C.C	1	1048,80
BOCACALLE	Solo Aleta		c/C.C		106,40
<b>Localidad de Maria I. VELA</b>					
MORENO	Pellegrini	Avellaneda	c/C.C	1	912,00
BOCACALLE	Completa, centro y aletas		c/C.C	1	279,00
					<b>2346,20</b>

Las cuadras que se pavimentan están con cordón cuneta existente, tienen un ancho entre cara exterior de los cordones de 9,00 mts. Y entre cunetas de los cordones, de 7.60 m o menor. Las mismas tendrá

---

LICITACIÓN PÚBLICA 12-01-21 "PAVIMENTACION EN HORMIGON DOS CUADRAS EN M.I. VELA Y GARDEY (II ETAPA)  
y MEJORAMIENTO URBANO- CONSTRUCCION VEREDAS EN LA PLAZA M.I. VELA"

---

un paquete estructural mínimo, que comprende, en hormigón un espesor mínimo de 0,18 m, y una base estabilizada/suelo seleccionado de 0,20 m de espesor compactado y terminado, se incluye además el saneo y/o tratamiento de la sub-rasante, en un espesor de 0,20 m.

### Veredas

Para construir las nuevas veredas, el método de cómputo será a ajuste alzado y para la misma será necesaria la demolición total de las veredas existentes. A conciliar con la inspección de obra.

A fin de adoptar un único criterio referente a circulaciones en espacios públicos de uso urbano, (veredas), se materializarán en hormigón elaborado del tipo H21, en paños regulares de 0.10 m de espesor, 2.00m de ancho y 5.00m de largo, con malla Q 131, con acabado peinado y bordes de 0.15 m lisos. A lo largo de las veredas perimetrales e internas habrá cada 5.00m paños de adoquines de 0.10 m de espesor, 1.70m de ancho y 0.35m de largo, a excepción del anillo central donde estos paños de adoquines serán de 2.75m de ancho y 0.35m de largo. Los paños propuestos serán ejecutados in-situ, para su aprobación por la inspección de obra, la contratista deberá presentar documentación técnica y certificaciones correspondientes a composición y resistencia, avalados por un profesional con incumbencias. El traslado, manipulación y colocación de los elementos propuestos serán a costa y cargo de la contratista.

En los sectores indicados en Plano de referencia, la contratista deberá construir Rampas de dimensiones y características graficadas como continuación de la vereda. La terminación de la misma será superficie lisa y ranuras como mecanismo antideslizante y además deberá colocarse las placas de alerta como se detallan. Se deberán tener en cuenta las pendientes mínimas para el drenaje superficial de las aguas.

La contratista proveerá la mano de obra y el material de acabado superficial, para la ejecución de las mismas (a excepción de las mallas Q131, la tierra negra para recalce y los adoquines que serán entregados por el contratante).

Estas tareas se realizarán con la utilización de Mano de Obra, Materiales y equipos para el movimiento de suelo, hormigón (pala cargadora, camiones cargadores, camión moto hormigonero), a cargo de la contratista.

La obra se medirá y certificará por obra terminada parcial o total de cada ítem, incluyendo el tratamiento de la sub-rasante y ejecución de base, medición que se realizará tomando la superficie total pavimentada, o bien la totalidad de cada ítem finalizado.

Plazo para la concreción de la obra de Pavimentación, treinta (30) días corridos a contar desde el Acta de Inicio de Obra.

La obra de Veredas se medirá y certificará de acuerdo al porcentaje de obra finalizado.

Plazo de concreción para la obra de Veredas, sesenta (60) días corridos a contar del Acta de Inicio de Obra.

Para ambas obras se establece un plazo para el mantenimiento y conservación de la obra a contar desde la firma del Acta de Recepción Provisoria, de 365 días corridos.

El Monto de inversión asciende a la suma de \$ \$ 13.942.550,00 (PESOS TRECE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA).

## **MEMORIA TECNICA**

- **ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PAVIMENTACION EN HORMIGON**

### **1) OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO DE ESPECIFICACIONES**

El presente pliego de bases y condiciones tiene por objeto licitar cuadras a pavimentar todas en hormigón simple, difiriendo en esta oportunidad los movimientos de suelo que se deben realizar, ya sea para la pavimentación como para la repavimentación, ya que en esta última se aprovechara lo existente por debajo del espesor del nuevo pavimento o bien se deberá mejorar los suelos de sub-rasante/base, así también los espesores mínimos de cada tipo de obra

### **2) MOVIMIENTO DE SUELOS SUB - ESTRATO:**

Se incluyen en este ítem, todas las tareas por movimiento y/o transporte de suelos hasta una distancia de 10 km, como así también la preparación de cancha, las cuales serán realizadas por la Empresa Contratista, con equipos propios y/o alquilados, y todos los trabajos de ejecución fina de cancha, tareas éstas que se realizarán con empleo de herramientas menores que provea el Contratista. En este ítem están incluidos todos los trabajos de ejecución de sub-base y/o tratamiento de la sub-rasante con aporte de material nuevo o simple saneamiento de la misma ya sea con agregado de cal/cemento u otras tareas de mejorado de lo existente por debajo de la base. Cuando a criterio de la Dirección Técnica de obra, se requiera aportar suelo seleccionado y/o cal para sanear las canchas a nivel de sub-rasante o de base o algún determinado bache o sector de suelos a modificar, este material deberá ser provisto por el Contratista. A tal fin cuando se llegue a cota de cancha se deberá realizar un muestreo del material existente o el que se adicione, para la determinación de un ensayo próctor estándar, de manera de obtener una densidad de suelo mínima de 1,45 t/m<sup>3</sup> y cuyos valores de compactación para toda adicción o remoción de cancha, deberán estar por encima del 98 % del ensayo próctor estándar. Esto también corre para el movimiento de suelos tanto para el Cordón cuenta como para los badenes de cruce, según paquete estructural indicado en el presente pliego

### **3) BASE DE SUELO SELECCIONADO Y/O ESTABILIZADO:**

Una vez aprobada la sub-rasante podrá construirse la base de suelo-estabilizado pétreo/suelo seleccionado, debiendo la empresa Contratista, aportar dicho material, según las exigencias del Pliego Único de Vialidad Pcia., en un espesor compactado y terminado de 0,20 m. y en los anchos consignados entre cunetas de cordones existentes. El material a utilizar será el que resulte de una granulometría de material pétreo 0/20, homogénea, con un máximo de suelo seleccionado a emplear, de un 20 %, y deberá cumplir con los siguientes requisitos:

Límite Líquido menor de 23; Índice de Plasticidad menor de 8; Valor Soporte (C.B.R.) embebido, compactación Proctor Standard, no menor de 60, con un hinchamiento menor del 1 % (medido en el ensayo C.B.R.). En caso de adicionarse suelo seleccionado solo, el mismo deberá ser aprobado por la inspección desde el yacimiento y los parámetros del mismo.

Se seguirán en cuanto a métodos constructivos materiales, controles y tolerancias a lo establecido en dichas Especificaciones Técnicas, complementariamente, el Pliego Único de Especificaciones Generales de Vialidad de la Pcia.

También para la base del pavimento se podrá utilizar el material existente en el lugar y los suelos existentes por debajo del sub estrato, tratándose de suelos limo - arenosos, aptos para ser utilizados como base del pavimento, esto quedará a criterio de la Dirección Técnica de la Obra. Lo indicado también corre para el movimiento de suelos tanto para el Cordón cuenta como para los badenes de cruce, según paquete estructural indicado en el presente pliego.

Se destaca que para el caso que al desmontar el espesor del pavimento es decir 0,18 m se observase que, lo que queda por debajo de este desmonte y a criterio de la dirección de Obra, es suelo apto para ser utilizado como base. Por lo tanto este ítem no será medido, ni certificado por la dirección de Obra, abonándose solamente el ítem 1 MOVIMIENTO DE SUELOS,

#### 4) MOLDEO:

Una vez que se haya aprobado la sub-rasante y a posteriori la base, se estará en condiciones de realizar el moldeo de obra, en los casos que así corresponda, para ello se respetaran los niveles de proyectos, anchos y líneas según se ha determinado en la documentación técnica o que la Dirección de Obra haya dispuesto conforme a las necesidades del terreno, o a respuesta del representante técnico de la empresa ante posibles dudas y/o pequeñas modificaciones. Los moldes tendrán que quedar perfectamente sujetos al suelo con clavos de fierros Ø 16/20, atornillados entre si tanto en la continuidad como en el caso de curvas o de caras vistas si correspondiese, mantener linealidades y cumplir con los niveles de proyecto ejecutivo de obra. Tal como se especificó los moldes deben estar



---

LICITACIÓN PÚBLICA 12-01-21 "PAVIMENTACION EN HORMIGON DOS CUADRAS EN M.I. VELA Y GARDEY (II ETAPA)  
y MEJORAMIENTO URBANO- CONSTRUCCION VEREDAS EN LA PLAZA M.I. VELA"

---

en buenas condiciones de uso y de buen mantenimiento, caso contrario la Dirección de Obra podrá ordenar el retiro y cambio por otros moldes de mejor calidad, no teniendo la empresa, derecho a reclamo de mayor plazo de obra por lo sucedido.

Se detalla que en muchos casos se hormigonará entre cunetas de los cordones existentes, prescindiendo de dichos moldes, pero se deberán tener en cuenta la linealidad y los niveles/espesores

Lo mencionado en este ítem también deberá ser considerado como especificaciones técnicas para el moldeo del cordón cuneta y/o badenes de cruce, sobre cancha, según rasante de proyecto y dimensiones de los mismos

#### 5) HORMIGONADO:

Una vez aprobada la obra de base y la cancha, por la Dirección de obra, sin cuya aprobación no se podrá continuar, debiendo la cancha estar debidamente compactada, nivelada, sellada y sin material suelto con humedad optima sin saturación del suelo, el cual podrá humedecerse en caso de necesidad con camión regador o bien con el propio equipo mixer, nunca se hormigonará con cancha seca ni tampoco con el suelo saturado de agua, en exceso El hormigón será colocado y distribuido dentro de los moldes/entre cordones existentes, sobre la base previamente humedecida, debiendo tenerse en todo momento, por lo menos, colocados los moldes correspondientes a media cuadra o más.-

El hormigón será depositado en forma que requiera el menor manipuleo posible, empleando palas y no rastrillos para extenderlo. -

Se hormigonará primeramente la parte correspondiente a la calzada, entre molde y molde, para hormigonar inmediatamente el cordón (si fuese necesario), de modo que forme una sola sección, no deberá transcurrir más de 45 min., de hormigonadas las losas, para hormigonar los cordones. -

Debe cuidarse al realizar estas operaciones, que el hormigón quede en íntimo contacto con los moldes, evitando la formación de huecos dentro del mismo, tarea que además de la distribución a pala, se deberá realizar mediante un vibrado en forma pareja y continua. -

La colocación del hormigón no se interrumpirá en los tramos comprendidos entre dos juntas transversales contiguas. -

Frente a las propiedades que posean entradas para vehículos y en aquellos casos en que lo soliciten los vecinos frentistas, mediante la exhibición del permiso correspondiente y previa conformidad de la Inspección, el Contratista construirá un rebajo del cordón en correspondencia con la entrada respectiva, no constituyendo dichas tareas adicional de obra alguno.

No se podrá hormigonar en días con temperaturas menores a 5 °C o superior pero en descenso constante

#### 6) VIBRADO:

El hormigón se enrasará entre los moldes por medio de regla vibradora que proveerá el Contratista y se la deslizará sobre la superficie como mínimo una pasada, de forma tal de lograr que el material se distribuya en toda la superficie para obtener una homogeneidad en todo el espesor del pavimento y también lograr una terminación uniforme. Si no quedase alisado se deberá posar la regla vibradora por segunda vez, para proceder posteriormente al fratasado, y el acabado final con cinta de alisado.

Para el caso del Cordón la tarea se realizará con fratachos grandes pero de mano, vibrando el hormigón con estos mismos o con vibrador de aguja, enrasando el material entre moldes

#### 7) FRATASADO:

Una vez culminado el vibrado y antes de que comience el proceso de fragüe se procederá al fratasado de la superficie del pavimento, empleando elemento de fratasados de 1,00 a 1,50 mts. de ancho, en este proceso se deberá realizar un vibrado manual con el elemento de fratasado, con esto se logra que no queden partículas pétreas que sobresalgan por encima de la superficie. Prestar atención con el agregado de agua para el fratasado, de ser necesario se deberá pulverizar la superficie con un mínimo agua y cemento, nunca incorporar agua mediante chorreado.

Terminada la tarea de fratasado se le deberá pasar la cinta de alisado, prestando especial cuidado de no dejar sobre la superficie terminada restos de lechada de material cementicio, de ser necesario se volverá a pasar la cinta o se retirará la lechada en forma manual.

#### 8) DOSIFICACION:

La dosificación será propuesta por la Empresa Contratista y aprobada por la Inspección de Obra, la que preverá un contenido mínimo de cemento de 330 Kg/m<sup>3</sup> (incluidas las pérdidas). El hormigón deberá producir una resistencia media no menor de 320 kg/cm<sup>2</sup>, para pavimento y cunetas de cruce. Para esto se deberá emplear un hormigón cuya resistencia característica a 28 días en probetas cilíndricas,

---

*LICITACIÓN PÚBLICA 12-01-21 "PAVIMENTACION EN HORMIGON DOS CUADRAS EN M.I. VELA Y GARDEY (II ETAPA)  
y MEJORAMIENTO URBANO- CONSTRUCCION VEREDAS EN LA PLAZA M.I. VELA"*

---

relación de esbeltez igual a 2 sea Tipo H 30, o su equivalente de resistencia media de 320 kg/cm<sup>2</sup> o más, a 14 días. Valores de resistencia menores a los mencionados, posibilitara a criterio de la Dirección de Obra, la remoción y vuelta a construir las losas o tramos rechazados, o bien se dejarán en observación por un tiempo mayor al que se suscribe el presente Pliego de Bases y Condiciones.

9) EQUIPOS:

La Empresa deberá mantener en obra en perfectas condiciones de uso todo el equipo destinado a la obra en cuestión

El no cumplimiento de este punto habilitará a la Dirección a paralizar la obra, con las multas que ello origine. La Dirección de Obra procederá a revisar las herramientas antes del comienzo del ítem a fin de autorizar su utilización, o para rechazar aquellos elementos que no reúnan las exigencias requeridas. En el caso de realizarse una revisión periódica y los elementos tanto de propiedad de la Empresa como los alquilados, no cumplan con los requisitos de limpieza y mantenimiento, esto dará origen a una sanción a la Empresa Contratista equivalente al incumplimiento de Ordenes de Servicio.

A requerimiento de la Dirección Técnica, la Empresa deberá proveer un vibrador portátil a fin de ser utilizado en la obra, en momentos que por situaciones particulares se lo necesite.

10) APROBACION DE LA DIRECCION DE OBRA:

El Contratista no podrá hormigonar hasta tanto la Dirección de Obra no haya aprobado la colocación de los moldes, y acepte la sub-rasante o base ejecutada a tal fin, o cualquier otra tarea que requiera la supervisión de la Dirección de Obra, antes del hormigonado. En caso de no cumplirse la linealidad de moldes, la Inspección podrá ordenar el retiro de toda la fila de moldes mal colocadas.

Tanto la base como la sub-base tendrán que estar perfectamente compactada, nivelada, sellada para ser ensayada y así la Dirección de Obra podrá aprobar o rechazar la misma según corresponda, realizando los respectivos ensayos de suelo y cancha, para verificar que cumpla con los parámetros técnicos indicados en estas especificaciones.

11) EXTRACCION DE MUESTRAS:

En cualquier momento y sin costo adicional la Dirección de Obra podrá ordenar la extracción de muestras, que se realizará con máquinas caladoras especiales, provista por la Empresa Contratista, como así también el personal operario de la misma.

#### 12) TERMINACION DE LA CALZADA:

Una vez concluidas las tareas de hormigonado y retiro de moldes, si fuese necesario, se deberá compactar y nivelar la calzada, respaldo de banquetas o veredas según proyecto; con material del lugar (tosca, suelo seleccionado) o el que surja de la compensación de tramos aledaños. La Empresa deberá cuidar que los volúmenes sobrantes de material no perjudiquen el tránsito vehicular de los sectores aledaños.

#### 13) ASERRADO Y TOMADO DE JUNTAS:

Durante el período de conservación el Contratista es responsable del estado de las juntas que deberán estar perfectamente llenas, sin exceso de material de relleno, recortando la parte sobrante de material.

Para rellenarlas empleará mastic bituminoso o cualquier otro elemento plástico que sea provisto por la Empresa Contratista, de manera tal de asegurar un perfecto sellado de las juntas para dejarlas sin ningún tipo de hueco u oquedades. Durante el Plazo de Mantenimiento y Conservación, la Empresa deberá realizar un retoque a todas las juntas de la obra.

#### 14) OBRAS DE INTERFERENCIAS:

En los casos de encontrarse con interferencias puntuales de los servicios Públicos o Privados, el Contratista será responsable y a su costa deberá realizar la remoción, construcción y modificación de la misma, incluidos los materiales para la ejecución de la tarea. Para ello previamente el Contratista, deberá solicitar y a su costa, copias de la documentación técnica de las obras de interferencias de los servicios Públicos y Privados existentes antes y al momento de ejecutarse la obra, tramitación que se realizará ante los organismos pertinentes, no pudiendo aducir falta de conocimiento por alguna infraestructura existente y que figura en la documentación entregada por los organismos.

#### 15) VALLADOS Y SEÑALIZACIONES

Cuando se deban realizar los respectivos cortes de calles como sus desvíos, tanto para repavimentación en asfalto como en hormigón, deberán estar perfectamente señalizados, mediante vallas reglamentarias con los carteles indicadores de los sectores en obra e indicaciones preventivas antes del corte del sector de obra. Así también las correspondientes señalizaciones nocturnas, tendrán

---

LICITACIÓN PÚBLICA 12-01-21 "PAVIMENTACION EN HORMIGON DOS CUADRAS EN M.I. VELA Y GARDEY (II ETAPA)  
y MEJORAMIENTO URBANO- CONSTRUCCION VEREDAS EN LA PLAZA M.I. VELA"

---

las indicaciones lumínicas y/o refractivas, de dimensiones generosas que se vean a distancia no menor a 50 m., en un todo de acuerdo a las Normativas Vigentes a nivel Municipal y/o provincial

Los cortes de calles a intervenir, además de los respectivos vallados deberán previamente ser notificados según los siguientes pasos a seguir,

1) Notificación fehaciente a cada vecino, de forma tal que ninguno de ellos, pueda argumentar desconocimiento de la obra. Dicha notificación será por nota tipo volante que se entregará a través de la Dirección de Obra, para que la empresa las reparta en cada domicilio, con las respectivas firmas del recibido por parte de los propietarios y/o inquilinos.

2) Notificación al responsable de la Coordinación de Tránsito y Transporte, para que se informe al transporte público de la intervención de obra. (si Correspondiese)

16) CRUCES DE AGUA Y CLOACAS A EJECUTAR:

16.1) Cruces de agua:

A la altura donde indiquen los planos de la Obra/Obras Sanitarias, se deberán ejecutar los cruces de agua a nuevo para todas las viviendas existentes o terrenos baldíos, para lograr futuras conexiones a red de agua. La tarea comprende excavación desde la parte exterior del cordón de un lado hasta la misma del otro lado, totalizando unos 12 ml de zanja a cielo abierto, en un ancho estimado de 0,40 m y una profundidad de 0,60 m, la que se podrá realizar a mano o con equipos mecánicos tipo retroexcavadoras, se preparara el fondo de la misma, con el propio suelo natural, libre de piedras y/o elementos que lastimen la cañería que se propone colocar, se extenderá en su interior una la cañería de Polietileno Ø 0,050 que servirá de caño camisa para la cañería de Ø 19/13 a colocarse para la futura conexión. Se completa el trabajo con la correspondiente tapada con suelo seleccionado, en capas de 0,20 perfectamente compactado, según proctor estándar al 98 %. La empresa contratista deberá proveer materiales, equipos, elementos y mano de Obra para la realización de todos los cruces. Antes del tapado de la cañería la Empresa deberá tener la correspondiente aprobación de la Dirección de Obra y de Obras Sanitarias respectivamente (mediante certificado técnico).

17) LABORATORIO DE OBRA:

Se utilizará el laboratorio de obra existente en la Municipalidad (Dirección de Pavimentación y Desagües Pluviales) para ensayos rutinarios.

Para este caso el Contratista deberá tener en cuenta la provisión de los siguientes elementos:

a) 6 moldes cilíndricos metálicos, bien rígidos (espesor de la chapa 3,2 mm.), de base paralela y perpendiculares al eje, de 15cm de diámetro interior (cerrado) y 30 cm. de altura.

b) Un monitor 24 pulg, de primera marca y calidad

Todos los elementos enumerados deberán estar en el laboratorio del obrador en el mismo momento de firmar el Acta de Replanteo e inicio de obra.

Los elementos enumerados en a), y b), una vez finalizada la obra quedarán en poder de la Municipalidad de Tandil-Dirección de Pavimentación y Desagües Pluviales.

A lo largo de todo el plazo de obra, y a jornada completa, el contratista deberá proveer a su costa, personal idóneo (con conocimientos de los ensayos para este tipo de obras), de forma tal que trabaje en el laboratorio, con el laboratorista municipal, para ensayos de suelos, y/o hormigones, se extraerán muestras todos los días, a distintos horarios y de distintos pastones para roturas a 7, 14 y 28 días. El no contar con este personal, dará lugar a la Dirección de Obra a paralizar los trabajos de obra, hasta tanto se cumpla con lo solicitado.

Los gastos por ensayos, si fuesen necesarios realizarlos en otros laboratorios oficiales o privados ante controversias que puedan surgir, correrán por cuenta del Contratista, en lo que tiene que ver al traslado y pagos por la ejecución de los mismos. Lo descripto se refiere a aquellos casos en que se quieran extraer testigos para ser ensayados o bien ante dudas sobre el material que se dispone en la obra, llevar probetas y muestras de material o suelo para que sean ensayados en otro laboratorio que autorice la Dirección de Obra.

NOTA: CARTEL DE OBRA: El contratista deberá colocar un cartel de obra de chapa, en cada localidad, y donde indique la Dirección de Obra, de 2,00 m de alto, por 3,00 m de ancho, que contenga la gráfica del municipio de Tandil, a proveer en su totalidad por el Contratista. Este deberá tener la suficiente rigidez estructural de manera tal de asegurar el mantenimiento del mismo en pie, a los vientos del sector, por lo que tendrá que contar con postes (mínimo 2), con la suficiente rigidez y asegurada su fundación al suelo del lugar. Se deberá colocar un cartel por cada obra calle de cada localidad y deberá permanecer mientras dure la ejecución de la obra.

---

LICITACIÓN PÚBLICA 12-01-21 "PAVIMENTACION EN HORMIGON DOS CUADRAS EN M.I. VELA Y GARDEY (II ETAPA)  
y MEJORAMIENTO URBANO- CONSTRUCCION VEREDAS EN LA PLAZA M.I. VELA"

---

- ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES EN MEJORAMIENTO URBANO-  
CONSTRUCCION DE VEREDAS EN LA PLAZA M.I. VELA

1) CARTEL DE OBRA

El contratista deberá proveer y colocar un cartel de obra de chapa, en cada localidad, y donde indique la Dirección de Obra, de 2,00 m de alto, por 3,00 m de ancho, que contenga la gráfica del municipio de Tandil. Este deberá mantenerse mientras dure la ejecución de la obra y tener la suficiente rigidez estructural de manera tal de asegurar el mantenimiento del mismo en pie, a los vientos del sector, por lo que tendrá que contar con postes (mínimo 2), con la suficiente rigidez y asegurada su fundación al suelo del lugar.

2) DEMOLICIÓN DE VEREDAS EXISTENTES, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL TERRENO:

Todas las tareas de demolición de veredas existentes, desmonte de suelo, carga y transporte hasta una distancia de 10km, nivelación y sellado de base definitiva, se realizaran con pala retro o mini cargador y elementos menores, estarán a cargo de la contratista.

3) RELLENO, NIVELACIÓN Y COMPACTADO:

Para el caso de la ejecución in-situ, luego del retiro de lo existente la cancha deberá quedar compactada y nivelada, lista para la colocación de las reglas o moldes, perfectamente saneada si fuese necesario, y posterior perfilado fino de cancha. Aquí la contratista deberá proveer la mano de obra, enseres y herramientas necesarias para llevar a cabo esta tarea. El compactado de la superficie se realizará mediante pisón neumático.

Para el caso de ejecución de vereda con elementos pre moldeados, posterior perfilado fino de cancha se colocará el material de asiento (polvo de piedra).

La contratista se compromete a dejar los accesos vehiculares, debidamente compactados y nivelados para tal fin.

4) CONTRAPISO Y VEREDA IN-SITU:

Sobre la superficie de cancha terminada, compactada y sellada se colocarán las respectivas reglas de guía, para la colocación del material de hormigón elaborado con malla Q131, que se colocará entre

éstas, y así dar nivel al mismo. El material de hormigón elaborado tipo H21, será transportado a obra en camión mixer, debiendo la empresa distribuirlo entre las reglas perfectamente aseguradas y niveladas, conforme a las pendientes indicadas por la Dirección Técnica de la obra, y con caída hacia el sector de escurrimiento, con una diferencia de pendiente, mínima de 1 cm y máxima de 3 cm. Los paños de contrapiso terminado quedará con un espesor de 0.10 m (+, - 1 cm) 2.00m de ancho y 5.00m de largo.

Finalizado el contrapiso se ejecutará sobre esta superficie un acabado peinado, con marco de borde longitudinal fratasado liso de 0.15 m de ancho. Las franjas de adoquines tendrán una terminación en cuadrícula en semejanza a veredas ya ejecutadas en otros espacios públicos, como ser Plaza Independencia, Plaza 25 de Mayo.

Se destaca que las veredas, se deberán construir conforme a las reglas del buen arte y oficio, no pudiendo la Empresa Contratista aducir, desconocimiento sobre los trabajos indicados, estén o no especificados en este pliego.

El trabajo se ejecutará iniciando con los paños vereda, desde el centro (largo de cuadra) avanzando hacia la ochava. Para su mejor entendimiento se aclarará en visita de obra o bajo inspección.

#### 5).- ELEMENTOS PREMOLDEADOS:

Para este caso, las placas propuestas deberán tener las características que a continuación se detallan:

Hormigón peinado: 1530 m<sup>2</sup>

Dimensiones: 2.00m de ancho x 5.00m de largo x 0.10m de espesor.

Dosificación: H21 vibrado.

Acabado. Liso fratasado más peinado antideslizante, color gris.

Franjas de adoquines: 72 m<sup>2</sup>

Dimensiones: 1.70m de ancho x 0.35m de largo x 0.10m de espesor

Material: Adoquines de granito.

Acabado: Terminación en cuadrícula. Similar a Plaza Independencia, Plaza 25 de mayo.

6).- RAMPAS: 29 m<sup>2</sup>



---

LICITACIÓN PÚBLICA 12-01-21 "PAVIMENTACION EN HORMIGON DOS CUADRAS EN M.I. VELA Y GARDEY (II ETAPA)  
y MEJORAMIENTO URBANO- CONSTRUCCION VEREDAS EN LA PLAZA M.I. VELA"

---

Dentro de la construcción de las veredas se ejecutarán rampas en la vía pública, ubicadas sobre las ochavas, en ambos lados. El desarrollo de la Rampa estará en coincidencia con la senda de cruce peatonal, respetando este lineamiento determinará el ancho de la rampa (ver plano) donde la senda finalizará sobre condón, ejecutando el rebaje hasta este con una pendiente no mayor a 1:6. La materialidad de dicha rampa será de H21, con un espesor de 0.10 m y con terminación de peinado uniforme y antideslizante.

7).- MOLDEO Y HORMIGONADO DE CONTRAPISO:

Una vez culminada la base, por debajo del nivel del contrapiso de las veredas, la Empresa Contratista procederá a ejecutar los trabajos finos de cancha y el completamiento que fuese necesario, de manera tal que la base de suelo natural quede en perfectas condiciones para la sustentabilidad de la vereda que se proyecta colocar, siguiendo la planificación técnica plasmada en la presente documentación.

Terminada la cancha, nivelada, compactada y sellada se estará en condiciones de colocar los moldes necesarios, reglas metálicas que deberá proveer el contratista, para dejar todo listo para la aprobación de la Inspección de obra y posterior hormigonado, o colocación de los elementos pre moldeados. El hormigón será colocado y distribuido dentro del ancho obrante entre las reglas metálicas, sobre la base previamente humedecida, debiendo tenerse en todo momento, por lo menos, colocados los moldes correspondientes a toda la jornada prevista de trabajo.-

El hormigón será depositado en forma que requiera el menor manipuleo posible, empleando palas y no rastrillos para extenderlo. Se hormigonará primeramente la superficie de obra, entre molde y molde, de modo que forme una sola sección totalmente homogénea, no deberá transcurrir más de 45 minutos de hormigonados los moldes, para el acabado final de la misma.

La colocación del hormigón no se interrumpirá en los tramos comprendidos entre dos juntas transversales contiguas.-

No se podrá hormigonar en días con temperaturas menores a 5 °C o superior pero en descenso constante. Se deberá evitar el hormigonado expuesto a temperaturas extremas, caso contrario será necesario arbitrar los medios para impedir fisuraciones por secado rápido u otros inconvenientes propios de las temperaturas extremas.

8).- EQUIPO:

La Empresa deberá mantener en obra y en perfectas condiciones el uso de todo equipo.

Deberá contemplar tareas de mensura, para resolver problemas que surjan de los desniveles oportunos.

El no cumplimiento de este punto habilitará a la Inspección a paralizar la obra, con las multas que ello origine. La Inspección procederá a revisar las herramientas antes del comienzo del ítem a fin de autorizar su utilización, o para rechazar aquellos elementos que no reúnan las exigencias requeridas. Los moldes serán revisados periódicamente y por último al finalizar la obra, debiendo el Contratista mantenerlos en perfecto estado, tal como estaban, al momento del inicio de la obra. Los elementos tanto de propiedad de la Empresa como los entregados al Contratista no cumplan con los requisitos de limpieza y mantenimiento, esto dará origen a una sanción a la Empresa Contratista equivalente al incumplimiento de Ordenes de Servicio.

A requerimiento de la Inspección, la Empresa deberá proveer un vibrador portátil a fin de ser utilizado a lo largo de toda la obra.

#### 9).- APROBACIÓN DE LA INSPECCIÓN:

El Contratista no podrá hormigonar hasta tanto la Inspección no haya aprobado la colocación de los moldes, y acepte la terminación fina de la base ejecutada a tal fin, o cualquier otra tarea que requiera la supervisión de la Inspección, antes del hormigonado. En caso de no cumplirse la linealidad de moldes, la Inspección podrá ordenar el retiro de toda la fila de moldes mal colocadas.

#### 10).- TERMINACIÓN DE LOS BORDES:

Una vez concluidas las tareas de hormigonado y retiro de moldes, si fuese necesario, se deberá compactar y nivelar la zona perimetral de la obra, recalzando los bordes, según proyecto y tal como indique la inspección de obra. Trabajos que se realizarán en forma manual con material del lugar, tosca, suelo seleccionado o el que surja de la compensación de tramos aledaños desde el borde vereda hasta el cordón. La Empresa deberá cuidar que los volúmenes sobrantes de material no perjudiquen el escurrimiento y las propias tareas de obra.

#### 11).- SEÑALIZACIÓN Y VALLADO:

La Empresa Contratista, a su cargo, deberá realizar el vallado y cercado total de la zona de trabajo, de manera tal de interrumpir el paso de personas ajenas a la obra. En este punto se aclara, que el

---

LICITACIÓN PÚBLICA 12-01-21 "PAVIMENTACION EN HORMIGON DOS CUADRAS EN M.I. VELA Y GARDEY (II ETAPA)  
y MEJORAMIENTO URBANO- CONSTRUCCION VEREDAS EN LA PLAZA M.I. VELA"

---

contratista será responsable por los daños a contrapisos y veredas ya ejecutados; y que no sean los indicados por la inspección, cómo necesarias a modificar o demoler.

12).- CRUCES PARA EL ALUMBRADO DE LA PLAZA:

A la altura donde indique la Dirección de obra -y en caso de ser necesario- se deberán ejecutar los cruces para el paso de la instalación eléctrica mediante vainas con caños de cañería de Polietileno Ø 0,050 m de diámetro con cajas estancas a cada lado de la vereda. Dicha vaina deberá quedar con una tapada de 15 cm por debajo del nivel inferior del contrapiso, para lograr futuras conexiones a red de alumbrado de la plaza.

13).- MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN:

La Obra se medirá y certificará por metro cuadrado de obra ejecutada, tomando el ancho de obra comprendido entre bordes externos por la longitud del paño terminado. Estando incluido en este único ítem todos los trabajos descriptos en el presente Pliego de Especificaciones de Obra, así mismo se seguirán todos los delineamientos de las Reglas del Buen Arte y Oficio para este tipo de Obra.

14).- LIMPIEZA DE OBRA:

Durante la ejecución de las tareas previstas en la presente obra, se realizará periódicamente la limpieza general de la misma, debiéndola mantener limpia y libre de escombros. La Contratista será la responsable de la limpieza del lugar. El retiro de los elementos que sea necesario para evitar su deterioro, será coordinado con la inspección de obra y realizado por personal propio. Asimismo, cuidará de no dañar ó ensuciar con el trabajo las placas de los cercos existentes. Deberá depositar todos los residuos de obra en contenedores, a su costa y cargo.

Quedará a cargo de la empresa contratista la reparación de todos aquellos deterioros que se produzcan como resultado de la presente obra, así como adecuar constructivamente la misma a la situación de la obra civil ejecutada.

- ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES PAVIMENTACION EN BLOQUE DE HORMIGON

1. Movimiento de suelos:

1.1 Todo el movimiento de suelo se medirá por m<sup>2</sup> en un ancho entre cunetas de cordón existente, incluyendo el espesor de la base, más el espesor del saneamiento, si hubiese que realizarlo.

1.2 Dentro de este ítem se incluye la construcción de la sub base de suelo seleccionado, provisión del material equipos y herramientas para la ejecución del ítem, en el espesor de 0,20 m y en el ancho indicado de obra, incluyendo el saneamiento de la misma.

1.3 La Certificación será en forma mensual y por todo el ítem finalizado, con pago dentro de los treinta días de aprobado el certificado

2. Construcción de Base de suelo seleccionado/ estabilizado:

2.1 Esto incluye todo el personal necesario, materiales de suelos o estabilizado pétreo, equipos viales y herramientas menores para ejecutar la obra de la base

2.2 Se medirá y certificará por metro cuadrado de obra terminada completamente incluyendo todas las tareas requeridas para la habilitación de la cancha con sus tareas menores.

2.3 La Certificación será en forma mensual y por todo el ítem finalizado, con pago dentro de los treinta días de aprobado el certificado. Este no se certificará si se determina que lo existente se puede a Criterio de la dirección de Obras usar como obra de base

3. Pavimento en hormigón Simple:

3.1 Este ítem incluye todos los materiales necesarios para la elaboración del hormigón, material de curado, material para el tomado de juntas, como así también el transporte del hormigón a la obra y la mano de obra para todos los trabajos que requiere el ítem

3.2 Se medirá y certificará por metro cuadrado de obra completamente finalizada, incluyendo todas las tareas mencionadas en el pto anterior

3.3 La Certificación será en forma mensual y por todo el ítem finalizado con pago dentro de los treinta días de aprobado el certificado

4. Cruces de Agua:

---

*LICITACIÓN PÚBLICA 12-01-21"PAVIMENTACION EN HORMIGON DOS CUADRAS EN M.I. VELA Y GARDEY (II ETAPA)  
y MEJORAMIENTO URBANO- CONSTRUCCION VEREDAS EN LA PLAZA M.I. VELA"*

---

4.1 para estos casos se certificará por unidad de cruces de agua, completamente terminados, en el ancho total de la calzada más los excedentes a cada lado que se requieran para la futura conexión.

4.2 Se medirá y certificará por cruce terminado de agua, incluyendo todas las tareas mencionadas en el pto. anterior

3.3 La Certificación será en forma mensual y por todo el ítem finalizado con pago dentro de los treinta días de aprobado el certificado.

NOTA: CARTEL DE OBRA: El contratista deberá colocar un cartel de obra de chapa, en cada localidad, y donde indique la Dirección de Obra, de 2,00 m de alto, por 3,00 m de ancho, que contenga la gráfica del municipio de Tandil, a proveer en su totalidad por el Contratista. Este deberá tener la suficiente rigidez estructural de manera tal de asegurar el mantenimiento del mismo en pie, a los vientos del sector, por lo que tendrá que contar con postes (mínimo 2), con la suficiente rigidez y asegurada su fundación al suelo del lugar. Se Deberá colocar un cartel por cada obra y localidad

## **PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES LEGALES**

**ARTÍCULO 1: NORMAS LEGALES:** Las obras objeto de la presente licitación se someterán a lo establecido en el presente Pliego de Bases y Condiciones. Además le serán de aplicación supletorias las disposiciones de la Ley Orgánica de las Municipalidades, del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, de la Ley N° 6021 de Obras Públicas, su Reglamento; Decreto Provincial N° 367/2017 y toda otra normativa vigente a la fecha de licitación. La citada Legislación se entiende como integrante de este Pliego.

Las disposiciones citadas, conjuntamente con las complementarias, aclaratorias o nuevas, establecidas en el presente Pliego, constituyen por adhesión las facultades y obligaciones a que deberán ajustarse las partes.

Los distintos documentos del Contrato se complementan entre sí, de manera que cualquier omisión en uno de ellos queda salvada por su referencia en el otro.

La Adjudicataria deberá hacerse cargo y salvar por su cuenta y riesgo los errores y/u omisiones del Presupuesto Oficial y realizar los trabajos según planos y pliegos a efectos de que la obra cumpla con la finalidad de la construcción.

**ARTÍCULO 2: NORMAS CONTRACTUALES:** La Ley de Obras Públicas N° 6021, su Decreto Reglamentario N° 5488/59 (T.O. 1976 - Código de Obras Públicas - Libro I) y sus modificatorios, en cuanto a las cláusulas de carácter contractual conjuntamente con las complementarias, aclaratorias o nuevas establecidas en el presente Pliego, constituyen por adhesión, las facultades y obligaciones a que deberán ajustarse las partes.

En los casos que existiere contradicción entre los mismos, se seguirá el orden de prelación establecido en el Artículo 32º, Apartado 14 del Decreto N° 5488/59.

Los distintos documentos del contrato se complementarán entre sí de manera que cualquier omisión de uno de ellos quede salvada por su referencia en el otro.

**ARTÍCULO 3: INTERPRETACIONES:** Siempre que en estos documentos se especifique "MUNICIPALIDAD" o "MUNICIPIO" se refiere a la Municipalidad de Tandil, "INTENDENTE" al señor Intendente Municipal de Tandil, "DIRECCIÓN" a la Dirección de Pavimentación y Obras de Desagües

---

LICITACIÓN PÚBLICA 12-01-21 "PAVIMENTACION EN HORMIGON DOS CUADRAS EN M.I. VELA Y GARDEY (II ETAPA)  
y MEJORAMIENTO URBANO- CONSTRUCCION VEREDAS EN LA PLAZA M.I. VELA"

---

Pluviales para la obra de la Pavimentación y a la Dirección de Espacios Verdes Públicos para la obra de las veredas de la Plaza, "INSPECCIÓN" al personal designado por la Municipalidad para la supervisión total de la Obra, "CONTRATISTA" a la persona o empresa a quien la Municipalidad adjudique la Obra, "OBRA" al objeto del contrato y extensión de la misma, "PLIEGO" al presente pliego de Bases y Condiciones y Especificaciones Técnicas.

**ARTÍCULO 4: OBJETO:** El presente proceso licitatorio tiene por objeto la contratación de la mano de obra y la provisión de los materiales necesarios para ejecutar la obra de construcción de 2 cuadras de urbanas en HORMIGON SIMPLE y el Mejoramiento Urbano – Construcción de veredas en M.I. Vela" descritas en las Memoria Descriptiva y conforme lo estipulado en las Especificaciones Técnicas Generales, Especificaciones Técnicas Particulares, el Pliego de Bases y Condiciones Legales, planos y la planillas de Cómputo y Presupuesto que componen el presente pliego.

**ARTÍCULO 5: PRESUPUESTO OFICIAL:** Se establece como monto oficial para la realización de toda la obra la suma de pesos trece millones novecientos cuarenta y dos mil quinientos cincuenta (\$ 13.942.550,<sup>00</sup>).

**ARTÍCULO 6: MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:** La obra se llevará a cabo mediante el sistema de UNIDAD DE MEDIDA y AJUSTE ALZADO, según el ítem que corresponda y que ya fuera aclarado en la Memoria del presente pliego, realizándose un contrato entre el Municipio y la firma que resulte adjudicataria de la obra.

**ARTÍCULO 7: LUGAR Y FECHA DE APERTURA:** El acto de apertura del presente proceso licitatorio se realizará el día y hora que establezca el Decreto de Llamado adjunto, en la Dirección de Compras y Suministros del Municipio de Tandil, ubicada en calle Belgrano N°417, planta alta, oficina 6 de nuestra localidad, o en la oficina/sala que se designe a tal fin, con la presencia (no obligatoria) de los oferentes que deseen participar, respetando el protocolo de COVID-19 vigente en cuanto a distanciamiento, uso obligatorio de tapabocas o barbijo, y la presencia de un representante por empresa.

**ARTÍCULO 8: SOLICITUD Y CONSULTA DE LEGAJOS:** Los planos, memoria descriptiva, Pliego de Bases y Condiciones, planillas y demás antecedentes podrán ser consultados por los interesados en la Web Municipal. El Pliego no tendrá costo y estará disponible para su adquisición solicitándolo al siguiente correo: [compras\\_proveedores@tandil.gov.ar](mailto:compras_proveedores@tandil.gov.ar), desde su publicación hasta 5 días hábiles antes de la apertura, inclusive.

Toda documentación que supere a la consignada en el párrafo anterior y que fuere necesario para el Contratista, se le suministrará mediante la reposición del sellado que fije la Legislación vigente.

En caso de dudas, sólo serán considerados los pedidos de aclaración que registren fecha de entrada anterior a los 3 (tres) días hábiles de la fijada para el acto de apertura de la licitación, excluido dicho día.

Las aclaraciones y respuestas, se llevarán a conocimiento de todos los adquirentes de los documentos de la licitación y serán incorporados al Legajo completo como formando parte de él.

**ARTÍCULO 9: DOMICILIO LEGAL Y ELECTRÓNICO DE LOS ADQUIRENTES:** Los adquirentes del presente Pliego deberán constituir domicilio legal en la Ciudad de Tandil y domicilio electrónico. Si la Municipalidad resolviera notificar a las Empresas adquirentes sobre aspectos relativos a la licitación de la obra, como documentación de propuesta, fecha de apertura, etc. no se considerará a tales efectos las que, habiendo retirado el correspondiente Pliego de Bases y Condiciones no hubieran constituido domicilio legal en el radio señalado, perdiendo todo derecho a reclamo por no haber recibido las notificaciones en sus domicilios fuera del Partido de Tandil.

**ARTÍCULO 10: INSCRIPCION:** Para ser admitidos en la presente licitación todo proponente deberá estar inscripto en el Registro de Proveedores de la Municipalidad de Tandil (Dirección de Compras y Suministros).

**ARTÍCULO 11: INFORMES A OBTENER POR LOS OFERENTES:** La presentación de la propuesta implica que los oferentes han estudiado cuidadosamente los documentos de la licitación y obtenido los informes pertinentes en relación a los materiales y mano de obra necesarios para la ejecución de la obra, así como acerca de cualquier otro dato que pueda influir en la determinación del costo de la misma. Asimismo presume que se han informado respecto a la configuración y naturaleza del terreno y del subsuelo, presunción que no limita para los casos que correspondiere, el derecho que admite el Artículo 38° de la Ley 6021 y su Decreto reglamentario.

**ARTÍCULO 12: CONOCIMIENTO DE LA OBRA:** Es condición ineludible que los oferentes visiten el lugar donde se realizará la obra que cotizan a los fines de:

- Conocer las características y condiciones de la obra;
- Prevenir los posibles inconvenientes que se opongan a una normal ejecución de la misma;
- Determinar las condiciones necesarias de provisión de agua, energía eléctrica, etc.;



---

LICITACIÓN PÚBLICA 12-01-21 "PAVIMENTACION EN HORMIGON DOS CUADRAS EN M.I. VELA Y GARDEY (II ETAPA)  
y MEJORAMIENTO URBANO- CONSTRUCCION VEREDAS EN LA PLAZA M.I. VELA"

---

- Conocer las omisiones o errores que pudieran observarse en el Presupuesto Oficial o en el Pliego;

En caso de no existir observaciones en las propuestas a este respecto, se entenderá que las mismas han sido incluidas dentro de la oferta presentada.

Atento los predios donde se realizaran las obras son de libre acceso y están perfectamente delimitados, no se exigirá constancia de visita a obra.

**ARTÍCULO 13: INHABILIDADES PARA OFERTAR:** podrán participar en esta licitación, por sí o por interpósita persona:

- Los quebrados mientras no hayan sido rehabilitados;
- Los concursados, excepto que acompañen póliza de seguro de caución, fianza o aval bancario equivalente al 120% del presupuesto oficial. Esta garantía es independiente a las demás requeridas en el presente pliego. La misma deberá cumplir con los requisitos estipulados en el artículo de las GARANTÍAS;
- Los inhabilitados por condena judicial;
- Los que hayan incurrido en incumplimiento en contratos anteriores suscritos con la Municipalidad de Tandil;
- Los que se encuentren suspendidos o inhabilitados en el Registro de Proveedores de la Municipalidad;
- Los que sufran inhibición general de bienes;
- Los que revistieren el carácter de funcionarios, empleados, contratados o cualquier otra naturaleza de relación de empleo con el Estado en el orden nacional, provincial o municipal;

Si la existencia de las mencionadas causales de inhabilidad se comprobare con posterioridad a la apertura de sobres, la Municipalidad podrá declarar la inhabilidad del oferente para presentarse en futuras licitaciones, por hasta el término de diez (10) años. Además de ello, procederá a rechazar la propuesta de oficio o a declarar la nulidad de la adjudicación o del contrato (según la oportunidad en que se detecte el incumplimiento), con pérdida del depósito de garantía de la oferta o del contrato según el caso, y sin necesidad de previa interpelación judicial o extrajudicial.

**ARTÍCULO 14: CAPACIDAD DE LOS OFERENTES:** Los oferentes deberán presentar los siguientes requisitos de capacidad:

**Certificados de Capacidad:** El oferente podrá presentar alguno de los siguientes Certificados de Capacidad:

A. El Certificado de Capacidad Técnica y Saldo de la Capacidad Financiera del Registro de Licitadores del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires u organismo que lo reemplace;

B. El Certificado de Capacidad de Contratación Anual expedido por el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios u organismo que lo reemplace.

Los mismos deberán estar vigentes. En caso de encontrarse próximos a su vencimiento, el oferente deberá acompañar constancia de haber iniciado los trámites de renovación pertinentes.

En caso de no contar con ninguno de los certificados enunciados en el inciso anterior, el oferente deberá presentar:

- Balances Contables correspondientes a los últimos tres (3) ejercicios exigibles, debidamente autenticados.
- Calificación Bancaria expedida por entidad con la cual opere regularmente: La entidad bancaria deberá indicar cuales son las líneas crediticias otorgadas al solicitante, por ejemplo, en préstamos de capital de trabajo, descuentos de cheques, acuerdos de descubiertos, etc. La misma deberá ser de fecha actual.
- En caso de no cerrar balances contables, presentar:
- Estado de Situación Patrimonial certificado por Consejo Profesional de Ciencias Económicas;
- Declaración jurada anual del impuesto a las ganancias, correspondientes a los últimos tres (3) años y papeles de trabajo emitidos por el aplicativo exigido por la AFIP;
- Declaración jurada anual de Ingresos Brutos de los últimos tres (3) años;

**ARTÍCULO 15: LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS:** Las propuestas serán presentadas en la Dirección de Compras y Suministros del Municipio de Tandil hasta el día y hora indicados para el Acto de Apertura de la licitación, siendo inadmisibles las presentadas posteriormente, aun cuando el Acto de Apertura sea llevado a cabo con demora.

---

LICITACIÓN PÚBLICA 12-01-21 "PAVIMENTACION EN HORMIGON DOS CUADRAS EN M.I. VELA Y GARDEY (II ETAPA)  
y MEJORAMIENTO URBANO- CONSTRUCCION VEREDAS EN LA PLAZA M.I. VELA"

---

**ARTÍCULO 16: FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS:** Las ofertas serán presentadas en formularios idénticos a los anexados al presente Pliego, siendo el oferente exclusivo responsable de los errores que cometiese en su redacción.

Las propuestas deberán redactarse en idioma castellano, escritas en computadora, sin enmiendas, raspaduras, entrelíneas o errores que no hayan sido debidamente salvados.

El incumplimiento de éste requisito podrá ser causal de inmediato rechazo de la propuesta.

**ARTÍCULO 17: DOCUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA:** La propuesta deberá ser presentada en dos sobres, consignando en ambos la referencia "Licitación Pública 12-01-21-PAVIMENTACION EN HORMIGON DOS CUADRAS EN M.I. VELA Y GARDEY (II ETAPA) y Mejoramiento urbano- Construcción de veredas en la plaza de M.I. Vela", sobre N° 1 o N° 2, según corresponda. Los sobres deberán contener la siguiente documentación:

Sobre N°1:

- a) **Garantía de la propuesta formalizada en alguna de las modalidades determinadas en el artículo siguiente;**
- b) **El presente Pliego completo debidamente firmado y aclarado por el oferente y su representante técnico en todas sus hojas;**
- c) **Contrato Profesional por el estudio y propuesta de licitación, firmado por profesional en calidad de representante técnico con incumbencias específicas en la obra, debidamente visado por el respectivo Colegio Profesional;**
- d) Declaración Jurada de aceptar la jurisdicción y competencia de los Tribunales del Departamento Judicial de Azul, ante cualquier situación legal que se suscite, Declaración Jurada de no encontrarse inmerso en alguno de los impedimentos descriptos en el artículo 13, Constitución de domicilio legal en la ciudad de Tandil, y constitución de domicilio electrónico, al cual se cursarán todas las notificaciones pertinentes. Deberá utilizarse el FORMULARIO FDCS 01 ADJUNTO;
- e) En caso de ser el oferente persona jurídica, documentación que acredite que el o los signatarios de la oferta están habilitados para representar a la sociedad formulando oferta y obligándola.

En caso de agrupación de colaboración empresaria, consorcio de cooperación o de unión transitoria de empresas –en adelante "agrupaciones" o "consorcios"—, el contrato que los sustente deberá establecer

claramente un objeto compatible con la presente licitación y su plazo de duración, del que deberán adjuntar copia certificada notarialmente con legalización del Colegio de Escribanos en caso de haber sido expedida en jurisdicción diversa de la Provincia de Buenos Aires.

Para las agrupaciones que se acuerden al solo efecto de esta licitación, su plazo de duración en ningún caso podrá ser inferior al que razonablemente demande la ejecución total de la obra que se licita.

Para las agrupaciones constituidas con anterioridad y en caso que la ejecución de la obra supere el plazo de duración del contrato de agrupación de colaboración empresaria, consorcio de cooperación o unión transitoria de empresa, deberán prorrogar su vigencia por el tiempo que demande la conclusión de la obra. En caso que el plazo de duración del contrato de colaboración empresarial venciera en el período que transcurra entre la fecha de apertura del sobre n° 1 y la de apertura del sobre n° 2, deberán acreditar la celebración del acuerdo de prórroga y el inicio del trámite de inscripción respectivo, asumiendo el compromiso de la conclusión del trámite correspondiente.

En el contrato base de las agrupaciones o consorcios, los miembros deberán asumir en forma expresa la plena responsabilidad principal, solidaria, ilimitada e indistinta, frente a la Municipalidad, por todos los efectos de la oferta y del contrato objeto de la presente licitación. Deberá presentarse la documentación exigida, respectivamente, por la Ley 19.550 con las modificaciones de la Ley 22.903 o la Ley 26.005.

Las Garantías de Oferta, de Contrato y en su caso de Anticipo Financiero, deberán ser presentadas o emitidas en forma conjunta por todos los otorgantes de la agrupación o consorcio;

f) Listado de obras ejecutadas en similares características técnicas y económicas a la obra que se licita, comprobadas mediante sus respectivas Recepciones Finales o Provisorias, y listado de obras en curso de ejecución, esta información debería contener como mínimo: monto de contrato, monto ejecutado, plazo de obra y fecha de inicio, ubicación de la obra y descripción. El Municipio podrá descalificar aquellas ofertas de empresas que no hayan acreditado la ejecución de obras de similares características;

g) Documentación referida a la capacidad técnico financiera de la entidad, mencionada en el artículo 14;

Sobre N°2:

**h) Planilla de Propuesta Básica Obligatoria y Planilla de Propuesta Alternativa con Anticipo Financiero, en idéntico formato que las integrantes en el presente pliego;**

**i) Planilla de Cómputo y Presupuesto en idéntico formato y contenido que la integrante en el presente pliego;**

**j) Planilla de Análisis de Precios de cada ítem de la planilla del Cómputo y Presupuesto, desagregados en todos sus componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias, y los**

---

LICITACIÓN PÚBLICA 12-01-21 "PAVIMENTACION EN HORMIGON DOS CUADRAS EN M.I. VELA Y GARDEY (II ETAPA)  
y MEJORAMIENTO URBANO- CONSTRUCCION VEREDAS EN LA PLAZA M.I. VELA"

---

**precios de referencia asociados a cada insumo incluido en el análisis de precios, indicando el código correspondiente del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Esta planilla también se requerirá, oportunamente, se integre por mail y en formato Excel.**

Todas ellas deberán ser suscriptas por el oferente y por un representante técnico.

El incumplimiento de los requisitos consignados en los apartados a, b, c, h, i y j serán causal de rechazo inmediato de la propuesta.

La omisión o insuficiencia en la presentación de los demás requisitos consignados en el presente artículo podrá ser salvado en el plazo y forma que al efecto se otorgue en el Acto de Apertura, o en el momento en que se tome conocimiento de los mismos.

**ARTÍCULO 18: GARANTÍA DE OFERTA:** La garantía de oferta deberá constituirse por el importe de pesos ciento cuarenta mil con 00/100 (\$140.000,00) y podrá ser presentada en cualquiera de las siguientes modalidades:

- Depósito en efectivo en Tesorería Municipal;
- Fianza o aval bancario;
- Póliza de seguro de caución digital;

La fianza o aval bancarios y la póliza de seguro de caución deberán constituir al garante en fiador principal pagador o codeudor solidario, se mantendrá vigente por todo el lapso que transcurra hasta la firma del contrato por el importe establecido y con expresa renuncia a exigir interpelación prejudicial o judicial previa y al derecho de excusión.

Las firmas de las fianzas y/o avales bancarios y las pólizas por seguro de caución deberán autenticarse por Escribano Público y legalizarse por el respectivo Colegio, en caso de ser de jurisdicción ajena a la de la Provincia de Buenos Aires.

Si se constituyera en efectivo, deberá efectuarse el depósito en la Tesorería Municipal, colocando en el sobre N° 1 el recibo correspondiente. No se admitirá en el sobre, dinero en efectivo. En caso de realizarse el depósito de garantía mediante cheque, los fondos deberán estar acreditados en la cuenta municipal al momento de la apertura.

Si el Oferente hubiere optado por presentar una oferta alternativa según el artículo 17° (Sobre N° 2) y la misma resultara adjudicada, el anticipo financiero se pagará por el licitante contra la constitución y otorgamiento a favor y satisfacción de la Municipalidad de Tandil de una Garantía de Anticipo Financiero por el ciento por ciento (100%) del monto que se anticipe, la cual deberá ajustarse a lo establecido en el artículo 37°.

Dicha garantía permanecerá en vigencia hasta que se haya reembolsado el pago anticipado, aunque su monto podrá ser reducido progresivamente siempre y cuando la naturaleza de la garantía convenida lo permita y en la medida del grado de avance de la obra.

**ARTÍCULO 19: AUTENTICIDAD DE LAS OFERTAS:** Para toda copia o fotocopia de la documentación que se presente a la licitación, la Comisión de Pre adjudicación podrá solicitar la autenticación por Escribano Público y legalización por el Colegio respectivo, en el caso que el certificado fuera de jurisdicción extraña. Se exceptúa del presente aquellas autenticaciones que expresamente se soliciten en otros artículos y que por lo tanto deberán incluirse en la Licitación, no pudiéndose suplir ni durante ni después del Acto Licitatorio.

**ARTÍCULO 20: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA:** Los oferentes deberán mantener sus propuestas por el término de treinta (30) días corridos a partir de la fecha fijada para la Apertura del Acto. Vencido dicho plazo, si el oferente no se hubiere retractado de su oferta en forma fehaciente dentro de los tres (3) días anteriores a dicho vencimiento, la propuesta se considerará automáticamente prorrogada por igual término.

El plazo de mantenimiento de las propuestas, en todo caso, quedará prorrogado de pleno derecho hasta el momento de la adjudicación, a menos que los oferentes se retracten por escrito. Si la retractación se produjera durante el período de mantenimiento de la oferta, dará lugar a la pérdida del depósito de garantía.

En caso de que el oferente deba subsanar la presentación de documentación para participar, la prescripción del plazo de mantenimiento de oferta quedará suspendida de pleno derecho, desde la fecha de apertura hasta la subsanación del vicio.

**ARTÍCULO 21: DESISTIMIENTO DE LA PROPUESTA:** Cuando el oferente desistiera de su propuesta antes de transcurrido el periodo de su mantenimiento, se le ejecutara la garantía de oferta constituida y podrá sancionárselo con la suspensión del registro de proveedores por un periodo de hasta tres (3) años y sin perjuicio de iniciar las acciones a que hubiera lugar.

---

LICITACIÓN PÚBLICA 12-01-21 "PAVIMENTACION EN HORMIGON DOS CUADRAS EN M.I. VELA Y GARDEY (II ETAPA)  
y MEJORAMIENTO URBANO- CONSTRUCCION VEREDAS EN LA PLAZA M.I. VELA"

---

Cuando el oferente que desistiera de su propuesta antes de tiempo, resultare el primero en orden de mérito, tal actitud dará lugar al cobro de una multa equivalente al monto que resulte de la diferencia entre su propuesta y la que deba adjudicarse en la misma contratación.

**ARTÍCULO 22: DÍA INHÁBIL. PÓRROGA DE APERTURA:** Si el día fijado para el acto de apertura del sobre fuera declarado feriado o de asueto administrativo, o se produjera algún hecho imprevisible que por razones de fuerza mayor impidiera la ejecución del citado acto, el mismo se realizará el día hábil inmediato siguiente, en el mismo lugar y hora indicados, o en fecha y hora establecida por la Dirección de Compras y Suministros.

**ARTÍCULO 23: APERTURA:** El acto de apertura del presente proceso licitatorio será llevado a cabo en lugar y fecha consignados en el artículo 7 y será realizado por los funcionarios integrantes de la Comisión de Apertura, con la presencia de los señores oferentes que deseen asistir.

En el lugar, fecha y hora establecidos, las autoridades encargadas de fiscalizar la licitación procederán a dar por iniciado el Acto. Al abrir los sobres N°1, procederán a verificar que los oferentes hayan cumplidos los requisitos establecidos en los artículos 9 a 18 del presente Pliego. Toda presentación que configure incumplimiento de los artículos mencionados podrá ser rechazada y las autoridades actuantes podrán abstenerse de abrir el sobre N°2. En este supuesto, deberán devolver el sobre al oferente con la leyenda "rechazado por no ajustarse a los requisitos establecidos para la presentación de la documentación licitatoria", dejando constancia de lo antedicho en el Acta de Apertura.

El resto de los sobres presentados que cumplan con los requisitos establecidos serán abiertos y escrutados.

De todo lo actuado, deberá dejarse constancia en el Acta de Apertura, que contendrá:

- Nómina de los Proponentes;
- Modalidad de garantías presentadas y sus respectivos montos;
- Monto y tipo de oferta presentado por cada uno de los oferentes
- Si las hubiere, nómina de las propuestas rechazadas y el motivo de su rechazo.

El Acto de Apertura del proceso licitatorio es de carácter solemne. Cualquier transgresión de los requisitos formales de su presentación la anulará insalvablemente. Para asegurar la validez del acto, deben respetarse las siguientes condiciones:

Las propuestas se considerarán de propiedad exclusiva de los encargados de fiscalizar el Acto de Apertura. En ningún momento serán devueltas a los proponentes sin haber sido previamente consideradas. Solo harán excepción las propuestas rechazadas por las causas previstas en el presente Pliego.

Está prohibido a los oferentes efectuar manifestaciones relativas a las causas de rechazo de las propuestas previstas en el Pliego. Cualquier aclaración que el proponente considere pertinente realizar será transcrita en el Acta de Apertura y oportunamente considerada por autoridad competente.

El Acta de Apertura será suscripta por todos los licitantes presentes y los funcionarios intervinientes.

**ARTÍCULO 24: COMISIÓN DE APERTURA:** La Comisión de Apertura estará integrada por el Director de Compras y Suministros, el Secretario de Planeamiento y Obras Públicas, y el Director General de Espacios Verdes Públicos y el Director de Pavimentación y desagües pluviales, o dependientes designados por ellos para su reemplazo.

**ARTÍCULO 25: IMPUGNACIONES:** Todos los oferentes admitidos por la Comisión de Apertura podrán tomar vista de las ofertas, dentro de los dos (2) días posteriores al cierre del acto de apertura en la Dirección de Compras y Suministros de la Municipalidad de Tandil.

En caso de realizarse impugnaciones, las mismas deberán ser presentadas con la firma del impugnante, certificada ante escribano público y la de éste legalizada por el respectivo Colegio Profesional, así como constancia de haber constituido la garantía prevista.

Conjuntamente deberá presentarse una garantía de impugnación. Dicha garantía deberá constituirse por cada una de las presentaciones realizadas, en un monto equivalente al veinte por ciento del monto establecido para la garantía de oferta. La misma deberá constituirse en efectivo en la Tesorería Municipal. Será devuelta sin ajuste ni indemnización a quien su pretensión le sea acogida favorablemente, dentro de los cinco (5) días hábiles de ser solicitada formalmente.

Las impugnaciones deberán ser debidamente probadas, ofreciéndose o aportándose las pruebas que hagan a los cargos formulados. El plazo para presentar las impugnaciones será de 48 hs. de haber vencido el plazo para tomar vista del expediente administrativo.

**ARTÍCULO 26: CONTINUIDAD DEL TRAMITE – RESOLUCION DE IMPUGNACIONES:** La presentación o interposición de recursos o impugnaciones no suspenderá el tramite licitatorio y no dará lugar a la suspensión de la adjudicación ni de los tramites posteriores relacionados con la ejecución del



---

*LICITACIÓN PÚBLICA 12-01-21 "PAVIMENTACION EN HORMIGON DOS CUADRAS EN M.I. VELA Y GARDEY (II ETAPA)  
y MEJORAMIENTO URBANO- CONSTRUCCION VEREDAS EN LA PLAZA M.I. VELA"*

---

contrato, excepto cuando por razones de interés público así lo disponga la Comisión de Pre adjudicación o, en su caso, el Departamento Ejecutivo.

**ARTÍCULO 27: MEJORA DE PRECIOS:** Si entre las propuestas presentadas admisibles, hubieren dos o más en igualdad de condiciones y con una diferencia de precios igual o inferior del cinco por ciento (5%), la Municipalidad podrá convocar (a su exclusivo juicio) a mejora de precios mediante sobre cerrado y para el día y hora que al efecto se señale, entre esos proponentes exclusivamente.

**ARTÍCULO 28: RESERVA DE LA MUNICIPALIDAD PARA EL RECHAZO DE LAS OFERTAS:** La Municipalidad conserva la facultad de rechazar todas las propuestas, sin que la presentación de las mismas confiera derecho a los proponentes para exigir su aceptación, ni a formular reclamo alguno.

**ARTÍCULO 29: COMISION DE PRE ADJUDICACION:** Sera la responsable de la evaluación técnico financiera de las ofertas recibidas y del establecimiento del orden de mérito de las mismas, y estará compuesta por el Secretario de Planeamiento y Obras Públicas, el área de Gestión de Procesos y los responsables designados para la inspección de obra, o quienes se designen en su reemplazo.

La adjudicación aconsejada por la Comisión de Pre adjudicación recaerá en la oferta más conveniente de acuerdo al libre criterio del mencionado órgano.

Se podrá aplicar el principio de prioridad de contratación a favor de personas físicas o jurídicas con domicilio y/o establecimiento comercial en el Partido de Tandil, siempre que se configuren similares condiciones en cuanto a oferta y demás condiciones ofrecidas, con respecto a ofertas realizadas por personas físicas y/o jurídicas con domicilio comercial y/o establecimientos comerciales en otros partidos o provincias. La prioridad a favor de los oferentes locales no será de aplicación en caso que la oferta ofrecida sea superior en un cinco por ciento (5%) al de las ofertas presentadas por quienes no resultan beneficiarios del principio referenciado.

**ARTÍCULO 30: RECUSACIONES:** Las recusaciones a los miembros de la Comisión de Pre Adjudicación se regirán por las normas respectivas de la Ordenanza General 267/80 y sus modificatorias.

**ARTÍCULO 31: COMPRE TANDIL:** Conforme lo normado por la Ordenanza n° 16721, se manifiesta lo siguiente:

Entiéndase como Proveedores Locales para la presente ordenanza y a los fines de “Compre Tandil”, a todas las empresas y/o individuos proveedores de insumos, bienes, servicios y/o contratos de obras, que se encuentren radicadas en el Partido y cuenten con habilitación municipal, con un período de anticipación de 12 meses al momento de la compulsión de precios que se encuentre en análisis, estar inscriptos en el registro de Proveedores Municipal, y ser contribuyentes de la Tasa Unificada de la Actividad Económica y del impuesto a los Ingresos Brutos.

La presente Ordenanza será de aplicación en todas las contrataciones que promuevan las distintas dependencias municipales, cuando la diferencia de precios no supere el 5% (cinco por ciento) y la calidad de los bienes y/o servicios comparados respondan a los estándares técnicos exigidos en el Pliego de la contratación.

Las empresas locales que hubieran cotizado dentro de los márgenes establecidos en el artículo precedente, serán convocadas a una mejora de oferta, en la que deberán igualar (al menos) o superar la mejor oferta que se hubiera recibido, lo que la habilitará para ser beneficiada con el derecho de prioridad para resultar adjudicataria de la compulsión.

**ARTÍCULO 32: ADJUDICACION:** La adjudicación, previo dictamen de la Comisión de Pre Adjudicación, recaerá sobre la Oferta más conveniente o ventajosa a juicio exclusivo de la Municipalidad, siempre que ella se ajuste a las condiciones establecidas en la licitación, considerando según corresponda:

- Importe de la propuesta;
- Antecedentes relacionados con la ejecución de Obras Públicas y Privadas, similares a la solicitada;
- Todo otro elemento que permita valorar la oferta, su financiación o variantes complementarias.

En igualdad de condiciones, se otorgará prioridad a los oferentes de Tandil, considerándose como oferente de Tandil a aquellos domiciliados dentro del Partido, que desarrollen actividad y que abonen los tributos Municipales. La presente licitación se podrá adjudicar a distintos oferentes por rubros completos para la Pavimentación o las Veredas de plaza.

**ARTÍCULO 33: FORMALIZACION DE LA ADJUDICACION:** La adjudicación se entenderá formalizada mediante Decreto que al efecto dictará el Departamento Ejecutivo de la Municipalidad, seguido de la notificación al o los adjudicatarios en su domicilio legal o constituido al efecto para la Licitación.

---

LICITACIÓN PÚBLICA 12-01-21 "PAVIMENTACION EN HORMIGON DOS CUADRAS EN M.I. VELA Y GARDEY (II ETAPA)  
y MEJORAMIENTO URBANO- CONSTRUCCION VEREDAS EN LA PLAZA M.I. VELA"

---

Dentro de los siete (7) días hábiles de su notificación, el adjudicatario deberá cumplimentar la garantía que hace mención el artículo 34. En caso de incumplimiento, podrá dejarse sin efecto la adjudicación, con pérdida del Depósito de Garantía de Oferta, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 81.

**ARTÍCULO 34: REPRESENTANTE TECNICO:** Deberá poseer Título Universitario o Terciario habilitante en la especialidad, el que deberá estar inscripto en el Registro, de acuerdo a las Leyes 10.405, 10.416 y 10.411, junto con sus Decretos Reglamentarios. Su permanencia en obra se especificará en cláusulas particulares cuando el tipo de obra lo requiera.

**ARTÍCULO 35: OBLIGACIONES DEL REPRESENTANTE TECNICO DE LA EMPRESA:** Además de las obligaciones que establece para el Representante Técnico la Ley de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires y las que podrá establecer el Pliego de Bases y Condiciones Legales o el de Especificaciones Técnicas, éste deberá estar presente en todas las operaciones de carácter técnico que sea necesario realizar en el curso de la construcción, tales como: replanteo, pruebas de resistencia, nivelaciones, mediciones para los certificados de obra, recepción provisoria, recepción definitiva, debiendo firmar todas las actas respectivas.

La incomparecencia del Representante Técnico o su negativa a firmar las actas respectivas, inhabilita al Contratista para formular reclamos inherentes a la operación realizada.

El Representante Técnico se hará directa y solidariamente responsable con la empresa contratista de la correcta y normal ejecución de los trabajos y de sus resultados. Antes del inicio de la obra deberá presentar copia del contrato con el profesional, visado por el Concejo de Profesionales y la Caja de Previsión de Profesionales correspondiente en la Provincia de Buenos Aires. Asimismo, conjuntamente con los certificados mensuales de obra deberá presentar copia del comprobante de pago de los aportes profesionales.

**ARTÍCULO 36: GARANTIA DE CONTRATO, GARANTÍA DE ANTICIPO:** Sera requisito previo a la suscripción del Contrato Administrativo de Obra Pública que el adjudicatario otorgue a favor de la Municipalidad, la garantía por cumplimiento de contrato, equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto de la oferta adjudicada, la que deberá constituirse en alguna/s de las siguientes modalidades:

- Depósito en efectivo en Tesorería Municipal

- Fianza o aval bancario.
- Póliza de seguro de caución.

Esta Garantía de Contrato, cubre las responsabilidades emergentes de los incumplimientos contractuales en que incurriera el Adjudicatario, comprendiendo los perjuicios que sufra el Municipio a causa del nuevo contrato que celebre para la continuación de las obras, o por la ejecución directa de estas, así como el pago de las multas que no satisfaga en término de la intimación que se le efectuare.

Será devuelta al Contratista dentro de los treinta (30) días corridos inmediatos siguientes a la fecha en que se efectúe la Recepción Provisoria de las obras.

Tratándose de depósitos en dinero en efectivo, será restituido por el importe de su valor nominal, sin que resulten exigibles intereses de ningún tipo, indexación, actualización o repotenciación alguna.

Tratándose de una póliza de seguro de caución, deberá mantenerse vigente hasta la Recepción Provisoria, las firmas deberán certificarse ante Escribano Público y, en caso de ser de jurisdicción ajena, autenticarse por el Colegio respectivo. Tampoco se computará desvalorización ni intereses, ni derecho a reintegro, reembolso o indemnización alguna por las primas abonadas durante la vigencia de aquella.

La Garantía, deberá permanecer inalterable, y en caso de que se produjeran afectaciones de la misma, en el plazo de diez (10) días hábiles de notificada la Contratista de ello, deberá integrar la diferencia hasta completar el monto total de dicho depósito, bajo pena de resolver el contrato por su culpa.

La Garantía de Contrato que se otorgue y constituya no implica limitación alguna de la responsabilidad contractual en que pudiera incurrir la empresa Contratista. El Municipio puede ejecutar la garantía a cuenta del mayor daño que pudiere sufrir y sin perjuicio de su derecho a exigir el resarcimiento integral derivado del o los incumplimientos de la Contratista, incluso los que reconozcan su causa en el nuevo contrato que deba celebrar el Municipio para la continuación de las obras, o por la ejecución directa de ésta.

**GARANTÍA FINANCIERA:** Si se hubiere optado por presentar una oferta alternativa según el artículo 17° (Sobre N° 2) y la misma resultara adjudicada, el anticipo financiero se pagará por el licitante contra la constitución y otorgamiento a favor y satisfacción de la Municipalidad de Tandil de una Garantía de Anticipo Financiero por el ciento por ciento (100%) del monto que se anticipe, podrá constituirse y otorgarse por alguno/s de los siguientes modos:

- aval o fianza bancarios;

---

LICITACIÓN PÚBLICA 12-01-21 "PAVIMENTACION EN HORMIGON DOS CUADRAS EN M.I. VELA Y GARDEY (II ETAPA)  
y MEJORAMIENTO URBANO- CONSTRUCCION VEREDAS EN LA PLAZA M.I. VELA"

---

- títulos públicos, bonos o letras de tesorería, certificados de deuda pública o cualquier otro valor similar;
- póliza de seguro de caución;
- derecho real de hipoteca.

Tratándose de aval o fianza bancarios, deberán constituir al garante en fiador principal pagador o codeudor solidario, con expresa renuncia a exigir interpelación prejudicial o judicial previa y al derecho de excusión. Los instrumentos en los que se extiendan el aval o fianza bancarios deberán autenticarse por Escribano Público y legalizarse por el respectivo Colegio en caso de ser de jurisdicción ajena a la de la Provincia de Buenos Aires.

En caso que la garantía se constituyera mediante la cesión en garantía de títulos públicos, bonos o letras de tesorería, certificados de deuda pública o cualquier otro valor similar, deberán observarse las siguientes prescripciones:

A los efectos de la integración de la garantía, serán dados por el Contratista y tomados por el Municipio por su valor nominal.

Deben ser emitidos por el Estado Nacional o la Provincia de Buenos Aires, y en este último caso que coticen oficialmente en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Si los títulos o bonos generasen intereses o se liquidaren y pagaren anticipos de capital, el Municipio deberá gestionar el cobro de los mismos y los retendrá también en carácter de garantía.

La titularidad de los títulos o bonos dados en garantía, sus intereses o amortizaciones de capital, pertenecen al Contratista.

El Contratista no podrá transferir los títulos o bonos dados en garantía sin autorización o conformidad expresa del Municipio.

Si por incumplimiento del contratista se ejecutaran estos títulos o valores, se formulará cargo por los gastos ocasionados y por la diferencia si fueran vendidos bajo la par. En el caso de que produjeran excedente, el mismo quedará a favor del contratista, sin intereses ni actualización, indexación o repotenciación alguna.

Si el adjudicatario optara por contratar un seguro de caución, el mismo deberá ser otorgado por una compañía aseguradora y mediante una póliza autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación:

- Indicador patrimonial "C" (Créditos/Activos): menor o igual a 38,79.
- Indicador patrimonial "D" [(Dispo. + Invers.) / Deudas con Aseg.]: mayor o igual a 136,50.
- Indicador patrimonial "E" [(Dispo. + Invers.) / (Deudas con Aseg. + Comp. Técn.)]: mayor o igual a 103,83.

La entidad aseguradora responderá ante el mero incumplimiento del Contratista a sus obligaciones derivadas del contrato que se suscriba, sin necesidad de una previa interpelación judicial o prejudicial o acción judicial contra los bienes de éste.

La póliza deberá autenticarse por Escribano Público y legalizarse por el respectivo Colegio en caso de ser de jurisdicción ajena a la de la Provincia de Buenos Aires.

Si el adjudicatario optara por la constitución de derecho real de hipoteca, la misma deberá sujetarse a los siguientes requisitos:

- Constituirse a favor de la Municipalidad de Tandil;
- Conceder a Municipalidad de Tandil 1º grado de preferencia;
- Podrá constituirse sobre inmueble de titularidad dominial del adjudicatario o de un tercero.
- El inmueble deberá tener un valor venal real, establecido por tasación oficial efectuada por el Municipio, equivalente, al menos, al total de la suma que se adelante por el Anticipo Financiero.
- El inmueble deberá situarse en jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires. En caso que se ofreciere un inmueble situado en otra jurisdicción, el Municipio tendrá derecho a desestimar la garantía.
- El inmueble gravado no podrá ser dado en hipoteca para garantizar otros créditos del adjudicatario o del tercero titular mientras esté vigente esta garantía.
- Si durante la vigencia de la hipoteca el inmueble fuera embargado o subastado y su producido no alcanzara a cubrir el Anticipo Financiero o su remanente, el Municipio tendrá derecho a exigir la constitución de una nueva Garantía de Anticipo Financiero, a través de alguna de las modalidades de garantía previstas en el art. 25.B., en cuyo caso la nueva garantía deberá otorgarse en el plazo de 30 días de requerida. Vencido el mismo sin que la nueva garantía se hubiera constituido, el Municipio podrá declarar la resolución del contrato por incumplimiento del contratista.
- Cualquiera sea la modalidad en que se constituya u otorgue la Garantía de Anticipo Financiero, permanecerá en vigencia hasta que se haya ejecutado en obra el pago anticipado, lo que se

---

LICITACIÓN PÚBLICA 12-01-21 "PAVIMENTACION EN HORMIGON DOS CUADRAS EN M.I. VELA Y GARDEY (II ETAPA)  
y MEJORAMIENTO URBANO- CONSTRUCCION VEREDAS EN LA PLAZA M.I. VELA"

---

determinará por certificación que al efecto expida la Dirección de Obras Públicas. Su monto podrá ser reducido progresivamente siempre y cuando la naturaleza de la garantía convenida lo permita y en la medida del grado de avance de la obra.

- La Garantía de Anticipo Financiero que se otorgue y constituya no implica limitación alguna de la responsabilidad contractual en que pudiera incurrir el Contratista. El Municipio puede ejecutar la garantía a cuenta del mayor daño que pudiere sufrir y sin perjuicio de su derecho a exigir el resarcimiento integral derivado del o los incumplimientos del Contratista, incluso los que reconozcan su causa en el nuevo contrato que deba celebrar el Municipio para la continuación de las obras, o por la ejecución directa de ésta.

Para la ejecución de la Garantía de Oferta, de Contrato o de Anticipo Financiero se observarán, sin perjuicio de otras que pudieren corresponder, las siguientes reglas:

El Municipio determinará por resolución fundada la obligación pendiente de cumplimiento y su valor, la que importará intimación de pago bajo apercibimiento de ejecución de la garantía.

Se notificará dicha resolución al Contratista en el domicilio constituido.

En el caso de que el Contratista no pague, el Municipio decidirá por resolución fundada la ejecución de la garantía, la que se llevará a cabo en la forma que corresponda a la modalidad de fianza adoptada por el Contratista. Los recursos o impugnaciones administrativos o judiciales que se dedujeren contra cualquiera de las resoluciones antes mencionadas o la intimación, no suspenderán la exigibilidad de la garantía.

**ARTÍCULO 37: RECAUDOS PREVIOS:** Previo a la firma del contrato administrativo de obra, el Proponente deberá presentar en el término que al efecto se señale, la siguiente documentación:

- La Garantía de contrato establecida en el artículo anterior;
- Contrato y locación de servicios con el Representante Técnico de la Obra con incumbencias en la misma;
- Contrato con el responsable del área de Higiene y Seguridad del trabajo que la empresa tenga contratado.
- Plan de trabajo propuesto.

**ARTÍCULO 38: FIRMA DEL CONTRATO:** El Adjudicatario deberá concurrir, previo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior, a firmar el Contrato Administrativo de Obra Pública dentro de los siete (7) días hábiles posteriores a la fecha en que sea formalmente citado por la Dirección de Compras y Suministros.

En caso de que la Adjudicataria no concurriera a firmar el Contrato dentro del plazo estipulado, incurrirá en multa equivalente al cinco por ciento (5%) del depósito de garantía por mantenimiento de oferta fijado en el artículo 18 del presente Pliego, por cada día hábil de demora. Si transcurridos veinte (20) días hábiles desde el vencimiento del plazo, no se hubiere formalizado el Contrato, la Municipalidad podrá dejar sin efecto la adjudicación, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna, con pérdida del depósito de garantía que se hubiere constituido. Firmado el Contrato se procederá a la devolución de las garantías de oferta de las firmas no adjudicatarias.

**ARTÍCULO 39: DOCUMENTOS DEL CONTRATO:** Forman parte del contrato:

- El presente Pliego de Bases y Condiciones, así como las aclaraciones o instrucciones dadas a conocer a los interesados.
- La propuesta con todos los elementos y documentos que la integran.
- El plan de trabajos y plan de acopio de materiales y/o elementos, si fuere exigido.
- Las órdenes de servicios que por escrito le impartan al Contratista.
- Los análisis de precios, cómputos métricos y presupuestos, según se haya solicitado o no.
- Los planos, planillas, cálculos de estructuras y demás elementos aprobados por la Secretaría de Gobierno.
- Las cláusulas especiales que contenga el contrato suscripto.
- Los planos de obra.

**ARTÍCULO 40: CESION DEL CONTRATO:** Firmado el Contrato, el Contratista no podrá cederlo ni transferirlo, en todo o parte a otra persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento sin la previa aceptación expresa y por escrito de la Municipalidad, y siempre de acuerdo con las exigencias que para esos supuestos establece la Ley de Obras Públicas de la Provincia y su Reglamentación. Para autorizar la cesión o transferencia del contrato deberán observarse los siguientes requisitos:

Que el cesionario, inscripto en la especialidad correspondiente en el Registro de Licitadores, tenga capacidad técnico financiera suficiente para la totalidad del contrato original y que el saldo de dicha capacidad supere el monto de la obra que falta ejecutar;



---

*LICITACIÓN PÚBLICA 12-01-21 "PAVIMENTACION EN HORMIGON DOS CUADRAS EN M.I. VELA Y GARDEY (II ETAPA)  
y MEJORAMIENTO URBANO- CONSTRUCCION VEREDAS EN LA PLAZA M.I. VELA"*

---

Que el cedente haya ejecutado, al tiempo de la cesión, no menos del cuarenta por ciento (40%) del monto de los trabajos, según certificación que al efecto expida la Secretaría de Gobierno.

Que el cesionario presente documentos que sustituyan a la garantía de cualquier naturaleza que hubiera presentado o se le hubiera retenido al adjudicatario cedente.

La cesión efectuada por el adjudicatario sin la previa autorización otorgada por la Municipalidad implicará la rescisión del contrato por culpa del adjudicatario, sin necesidad de previa interpelación judicial ni extrajudicial.

**ARTÍCULO 41: PLAN DE TRABAJO:** Dentro de los cinco (5) días de firmado el Contrato, el Contratista deberá presentar el Plan de Trabajos definitivo, el que regirá estrictamente una vez aprobado por la Municipalidad. Vencido el plazo antedicho se le aplicará al Contratista una multa del uno por ciento (1%) del depósito de garantía de Contrato por cada día de demora. Esta deberá hacerse efectiva en el acto de presentación del plan de trabajos definitivo sin cuyo requisito no será aceptado.

Se presentará además, una nómina detallada del equipo a utilizar en obra, con marca, modelo, propietario y fecha de ingreso a la misma. La Municipalidad podrá exigir el reajuste del Plan cuando se hayan otorgado prórrogas del plazo contractual.

**ARTÍCULO 42: REPLANTEO DE LA OBRA:** La Municipalidad solicitará al Contratista iniciar el replanteo dentro de los cinco (5) días de aprobado el Plan de Trabajo. Si el Contratista no concurriera a la primera citación, se hará pasible de la multa fijada en el artículo anterior de estas cláusulas. De no concurrir a la segunda citación se rescindirá el Contrato con la pérdida del total del depósito de garantía.

**ARTÍCULO 43: FECHA DE ORIGEN PARA LOS TERMINOS DEL CONTRATO:** Desde la fecha del primer replanteo, corren los términos para iniciar, ejecutar y terminar la obra. Se labrará el Acta de Inicio de la obra el día que se realiza el primer replanteo.

**ARTÍCULO 44: FECHA DE INICIACION DE LOS TRABAJOS:** El Contratista deberá dar comienzo a los trabajos dentro del plazo de dos (2) días hábiles de la fecha de primer replanteo. El incumplimiento de ésta, hará pasible al Contratista de una multa establecida en el artículo 82 del presente Pliego.

**ARTÍCULO 45: PLAZO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS:** Se fija como plazo para la ejecución de las obras objeto de esta licitación de la siguiente forma: Pavimentación treinta (30) días corridos a contar desde el Acta de Replanteo de la Obra. Veredas; sesenta (60) días corridos a contar desde el Acta de Replanteo de Obra, conforme lo señalado en el artículo 42.

**ARTÍCULO 46: INSPECCION DE LAS OBRAS:** La ejecución de los trabajos se efectuará bajo la Inspección que designe la Municipalidad. El Contratista y a su exclusiva cuenta, pondrá a disposición de la Dirección Técnica el personal, material, medios de movilidad y elementos necesarios para efectuar los replanteos, mediciones, tomas de muestras, ensayos e inspecciones en general, desde el día del inicio de la obra hasta su Recepción Definitiva.

**ARTÍCULO 47: VIGILANCIA, SEGURIDAD Y ALUMBRADO DE LA OBRA:** Incumbe al Contratista la responsabilidad desde que se inicia hasta el final de la obra, respecto de la vigilancia y seguridad continua del predio, para prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos, así como lo relativo al servicio de prevención de accidentes que puedan afectar a bienes o personas de la administración o de terceros, colocando luces y señales de peligro y adoptando todas las medidas de precaución necesarias en todas aquellas partes de la obra donde puedan producirse accidentes, sin perjuicio de lo que dispusiere específicamente el Pliego de Bases y Condiciones, o en su defecto, lo que ordene la Inspección en caso de evidente falta de medidas al respecto.

La adopción de las medidas a que se alude precedentemente, no eximirá al Contratista de las consecuencias de los hechos que allí se prevén.

Los gastos provenientes de energía eléctrica, para el alumbrado y fuerza motriz, así como de agua para la construcción, serán por cuenta del Contratista.

**ARTÍCULO 48: SEÑALIZACION DE DESVIOS:** En los lugares donde sea necesario el desvío del tránsito, provocado por la ejecución de las obras, el mismo deberá ser señalizado en forma adecuada de día y de noche con letreros reglamentarios, pintado con material reflectante. Dichos letreros deberán ser colocados en los lugares y en la cantidad que exija la Inspección y con las leyendas indicadas por la misma.

**ARTÍCULO 49: APROVISIONAMIENTO DE MATERIALES:** Cuando exista la imposibilidad en plaza de conseguir materiales exigidos por la documentación y el Contratista no haya formulado ninguna observación por escrito con una anticipación mayor de setenta y dos (72) horas al inicio de obra, el

---

LICITACIÓN PÚBLICA 12-01-21 "PAVIMENTACION EN HORMIGON DOS CUADRAS EN M.I. VELA Y GARDEY (II ETAPA)  
y MEJORAMIENTO URBANO- CONSTRUCCION VEREDAS EN LA PLAZA M.I. VELA"

---

Contratista no tendrá derecho a alegar esa circunstancia durante la ejecución de la obra para provocar un cambio de materiales.

En los casos de materiales de precaria entrega en plaza, el Contratista deberá prever dicha circunstancia, para que al llegar el momento de su empleo, no se produzcan por la falta de los mismos, entorpecimientos en la marcha de los trabajos. Tal obligación debe cumplimentarse en el plazo perentorio de sesenta (60) días corridos a partir del momento de la notificación mediante Orden de Servicio impartida por la correspondiente Inspección.

**ARTÍCULO 50: CONSTRUCCIONES PROVISIONALES PARA EL OBRADOR:** El Contratista tendrá en la obra cobertizos, depósitos y demás construcciones provisionales que se requieren para la realización de los trabajos. Estos locales se dispondrán de manera que no molesten la marcha de la obra. Todos los edificios provisionales serán conservados en perfecta higiene por el Contratista, estando también a su cargo el alumbrado y la provisión de agua a los mismos.

Si por el lugar de realización de la obra no fuere posible o no se requieran tales construcciones provisionales, la Inspección dispondrá lo conducente al respecto.

**ARTÍCULO 51: CARTEL DE OBRA:** El Contratista estará obligado a colocar un (1) cartel indicador de la obra en el lugar señalado por la Inspección. Dicho letrero se hará siguiendo las estipulaciones de la Municipalidad.

**ARTÍCULO 52: MATERIALES RECUPERABLES:** En todos los casos, los materiales, equipos y elementos provenientes de demoliciones, reemplazos, reacondicionamientos o sobrantes de la provisión de los distintos ítems de la presente contratación, serán entregados a la Municipalidad, limpios y ordenados.

La Inspección de obra indicará al Contratista el lugar donde deberán ser depositados.

**ARTÍCULO 53: UNION DE LAS OBRAS NUEVAS CON LAS EXISTENTES - ARREGLOS DE DESPERFECTOS:** Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar en cualquier forma obras existentes o aledañas, estará a cargo del Contratista y se considerarán comprendidas sin excepción, en la propuesta que se acepta:

La reconstrucción de todas las partes removidas y la reparación de todos los desperfectos que a consecuencia de los trabajos se produzcan en las obras o instalaciones existentes, aledañas a la obra;

La provisión de todos los materiales y la ejecución de todos los trabajos necesarios para unir obras nuevas con las existentes;

La provisión de todo material o ejecución de trabajos al objeto antes dispuesto, será de calidad, tipo, forma y demás requisitos equivalentes y análogos a los similares previstos o existentes.

**ARTÍCULO 54: RESPONSABILIDAD POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS:** El Contratista es siempre responsable de la correcta ejecución de la obra a su fin, y en consecuencia por todos los desperfectos que puedan producirse durante la ejecución y conservación hasta la Recepción Definitiva.

La inspección pondrá en conocimiento del Contratista tales desperfectos, defectos o deterioros, y éste deberá proceder a su reparación o arreglo en el plazo en que se le señale; vencido dicho plazo, la Municipalidad podrá encargarse los trabajos a un tercero por cuenta y cargo del Contratista, descontando el importe de los mismos del depósito de garantía, sin perjuicio de las penalidades que pudieran corresponder según las circunstancias del caso.

El Contratista ejecutará los trabajos de tal forma que resulten enteros, completos y adecuados a su fin, aunque los planos y las Especificaciones Técnicas no mencionen todos los detalles necesarios al efecto, sin que por ello tenga derecho al pago de adicional alguno.

**ARTÍCULO 55: INTERFERENCIAS E IMPREVISTOS:** El Contratista tiene la obligación de efectuar todas las gestiones o trámites ante empresas nacionales, provinciales o municipales y entidades privadas que poseyeran instalaciones de servicios públicos afectados por la ejecución de los trabajos, dentro de los treinta (30) días corridos posteriores a la firma del contrato.

Antes de iniciar las obras, y con la debida anticipación, el Contratista iniciará las gestiones para la remoción de obstáculos naturales y/o artificiales y reconstrucción de las instalaciones superficiales o subterráneas, visibles o no, que interfieran con la obra contratada, se encuentren o no consignadas en los planos, no excluyéndose al Contratista de la responsabilidad de verificar la exactitud de los datos consignados en los mismos, para lo que deberá realizar todas las gestiones conducentes a tal fin. No podrá exigir pago alguno por estos conceptos.

Todas estas gestiones serán realizadas en forma tal que una eventual demora en la obra no resulte atribuible a su falta de diligencia. Agotada la última instancia posible del trámite, acreditará esta situación ante la Dirección, mediante una copia de cada comunicación presentada a los prestatarios o

---

LICITACIÓN PÚBLICA 12-01-21 "PAVIMENTACION EN HORMIGON DOS CUADRAS EN M.I. VELA Y GARDEY (II ETAPA)  
y MEJORAMIENTO URBANO- CONSTRUCCION VEREDAS EN LA PLAZA M.I. VELA"

---

usufructuarios de las instalaciones que den lugar a la interferencia o imprevisto, con su acuse de recibo y observaciones si las hubiere.

El Contratista será el único responsable de los desperfectos que la remoción y reconstrucción de las interferencias produzcan en la obra contratada.

Será asimismo responsable de los daños y perjuicios causados por su impericia o negligencia en la ejecución de la obra a su cargo, o por deficiencia en las averiguaciones a que se refiere éste artículo, ocasionados en las instalaciones que interfieran con la misma.

**ARTÍCULO 56: PERMANENCIA DEL CONTRATISTA O SU REPRESENTANTE EN LA OBRA:** El Contratista o su Representante, autorizado y aceptado por la Municipalidad, deberá hallarse presente durante las horas de trabajo, bajo pena de suspenderse las tareas.

La aceptación de un Representante no releva al Contratista de la vigilancia periódica de los trabajos, debiendo estar presente cuando así lo exigiese la Inspección.

**ARTÍCULO 57: COMUNICACIONES DEL CONTRATISTA - LIBRO DE NOTAS DE PEDIDO:** El Contratista comunicará a la Inspección, las observaciones que le merezcan la marcha de los trabajos, en el libro de Notas de Pedidos que llevará al efecto, según se dispone a continuación:

- La Contratista proveerá el Libro de Notas de Pedido debidamente foliado por triplicado.
- El Libro de Notas de Pedido será visado por la Inspección.
- Las Notas de Pedido se extenderán con lápiz tinta o bolígrafo preferiblemente en letra de imprenta y con redacción precisa, a fin de evitar cualquier clase de duda en su interpretación y alcance.
- El contratista entregará a la Inspección el duplicado y el triplicado de las Notas de Pedido, considerándose que sólo se las tendrá por existentes a partir de la fecha en que la Inspección acuse recibo en el Original, salvo que el Contratista emplee otro modo de notificación auténtica, cierta y fehaciente.
- La Inspección deberá considerar y resolver las Notas de Pedido dentro de los diez (10) días hábiles subsiguientes a la recepción de las mismas, siempre que se encuentre dentro de sus atribuciones la decisión acerca del problema planteado. La no resolución dentro del plazo señalado, faculta al Contratista para recurrir ante la Secretaría de Gobierno.

- La Inspección en todos los casos archivará en una carpeta especial, todas las Notas de Pedido, como elemento de consulta para cualquier problema, a modo de registro de cuestiones planteadas por el Contratista.
- Cuando se produjere alguna divergencia entre el Contratista y la Inspección acerca de un problema planteado por Nota de Pedido, la Inspección deberá remitir de inmediato una copia de la misma a la Secretaría de Gobierno.

**ARTÍCULO 58: ORDENES DE SERVICIO:** Las Órdenes de Servicio que la Inspección imparta durante la ejecución de las obras, serán cronológicamente consignadas en un libro foliado y sellado, denominado "Libro de Órdenes de Servicio" que permanecerá en su poder. Las Órdenes de Servicio deberán ser notificadas al Contratista o su Representante Técnico.

En caso de que el Contratista o su Representante Técnico se nieguen a notificarse, la Inspección le entregará una copia de la Orden, firmando en el original un testigo que dará fe que la copia se entregó, dejándose constancia de la negativa a notificarse, lo que producirá los mismos efectos que la notificación personal.

Se considerará que toda Orden de Servicio está comprendida dentro de las estipulaciones del Contrato, que no importa modificación de lo pactado ni encargo de trabajos adicionales, salvo el caso de que en ella se hiciera manifestación explícita de lo contrario.

Cuando el Contratista considere que en cualquier orden impartida se exceden los términos del Contrato, podrá deducir reclamación fundada mediante Nota de Pedido, dentro del término de cinco (5) días hábiles a contar de la fecha de notificación de la Orden de Servicio.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el Contratista quedará obligado a cumplir la orden de inmediato, sin poder luego efectuar ulteriores reclamaciones por ningún concepto, aun cuando hubiere observado la orden o consignada reserva de derechos al pie de la misma y al tiempo de notificación.

La reclamación del Contratista opuesta a cualquier Orden de Servicio, no lo eximirá de la obligación de cumplirla, si ella fuera reiterada o ratificada, sin perjuicio de las compensaciones que puedan corresponderle, si probare que las exigencias impuestas variaren las condiciones del contrato.

En caso de incumplimiento, se hará pasible el Contratista de las multas previstas en el Pliego de Bases y Condiciones completo, pudiendo además la Municipalidad, mandar ejecutar en cualquier momento a costa de aquel, los trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado de obra o

---

*LICITACIÓN PÚBLICA 12-01-21 "PAVIMENTACION EN HORMIGON DOS CUADRAS EN M.I. VELA Y GARDEY (II ETAPA)  
y MEJORAMIENTO URBANO- CONSTRUCCION VEREDAS EN LA PLAZA M.I. VELA"*

---

mayores costos que se le extienda, y en su caso, subsidiariamente de los fondos de reparo o la garantía constituida.

**ARTÍCULO 59: DISCREPANCIAS DE LA CONTRATISTA CON LA INSPECCION:** Las divergencias que surgieran durante la ejecución de los trabajos serán salvadas en primer término en el ámbito de la Municipalidad y las decisiones de ésta serán definitivas en lo relativo a la calidad de los materiales y a la solidez y buena ejecución de los trabajos.

En ningún caso podrá el Contratista suspender las tareas ni aun parcialmente porque existan divergencias en trámite, bajo pena de aplicar las multas previstas en el artículo 81.

Transcurrido un lapso de 15 (quince) días corridos sin que se trabaje, podrá la Municipalidad rescindir el Contrato con pérdida de la garantía del mismo.

**ARTÍCULO 60: PERSONAL DE OBRA:** El mínimo de personal que se empleará en las obras será el que la Inspección considere necesario para dar cumplimiento al Plan de Trabajos aprobado. Mientras dure la ejecución de las obras el setenta y cinco por ciento (75%) como mínimo, del personal que trabaje en la misma, será de nacionalidad argentino, debiendo preferirse el radicado en la localidad.

**ARTÍCULO 61: SEGURO POR ACCIDENTES DE TRABAJO:** Es obligación del Contratista asegurar al personal de la obra en una A.R.T. reconocida por la Superintendencia de Seguros de la Nación, durante el término de la ejecución de la obra, debiendo hacerlo por la totalidad de los jornales, invocando taxativamente los riesgos que cubre, reconociéndose su incapacidad total o parcial, asistencia médica, internación y medicación.

La póliza respectiva será presentada a la Municipalidad dentro de los treinta (30) días de iniciada la obra.

En el caso de incumplimiento de lo establecido precedentemente se suspenderá la ejecución de la obra sin interrupción de los plazos contractuales.

Toda modificación o renovación de póliza debe ser autorizada previamente por la Municipalidad.

Asimismo, el Contratista deberá presentar cuando le sea requerido, un certificado de la Compañía de Seguros del monto de la Póliza a la fecha del requerimiento.

## **ARTÍCULO 62: APORTES A ORGANISMOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y SIMILARES:**

El Contratista es el único responsable del cumplimiento y observancia de la legislación laboral y de la seguridad social respecto de sus dependientes. Es a su cargo la obligación de ingresar los fondos de seguridad social y los sindicales, sea como obligado directo o como agente de retención, quedando obligado a ingresar los aportes y contribuciones exigibles con destino a organismos de seguridad social, aportes jubilatorios, obra social, aportes sindicales, fondo de desempleo y cualquier otro que pudiera corresponder.

La Municipalidad podrá requerir al Contratista, cuando lo estime oportuno, el número de Código Único de Identificación Laboral de cada uno de los trabajadores o la Libreta de Fondo de Desempleo o cualquier otra inscripción, registración o constancia que imponga la Ley 22.250 y sus modificatorias, las constancias de pago de las remuneraciones, los comprobantes de pago mensuales que acrediten haber dado cumplimiento en forma regular a los aportes de la seguridad social y sindicales, la documentación que acredite haber dado cumplimiento con la cobertura de la Ley 24.557 de Riesgos de Trabajo, respecto de todo el personal ocupado en la obra, como asimismo al Decreto Nacional N° 1475/64 o los que con posterioridad se dictaren a ese respecto. El Contratista deberá presentar la documentación pertinente en el plazo de diez (10) días de serle requerida.

En caso que el Municipio debiera afrontar, por cualquier causa, el pago de tales conceptos, sus recargos, intereses, multas e inclusive honorarios profesionales, el Contratista deberá reembolsarle los mismos con sus intereses desde que el pago hubiere sido hecho, pudiendo hacerse efectivo este reembolso de la Garantía de Contrato o de los créditos pendientes de cobro que tuviere el Contratista.

**ARTÍCULO 63: DISCIPLINA EN LA OBRA:** El Contratista será responsable de la disciplina en la obra. La Inspección de la obra podrá ordenar por escrito al Contratista, el relevo de la obra del personal que por su incapacidad, mala fe o insubordinación, falta de seriedad y respeto, perjudiquen la buena marcha de los trabajos.

**ARTÍCULO 64: ERRORES DE OBRA POR TRABAJOS DEFECTUOSOS:** El Contratista en ningún momento podrá alegar descargos de responsabilidad por la mala ejecución de los trabajos o por las transgresiones de la documentación contractual, fundándose en incumplimiento por parte del subcontratista, personal de proveedores, o excusándose en el retraso por parte de la Inspección de entregarle detalles y planos, o en la comprobación de errores o faltas.

Todo trabajo que resultare defectuoso debido al empleo de materiales de calidad inferior a lo establecido en la documentación contractual, o de una mano de obra deficiente, o por imprevisión, o



---

LICITACIÓN PÚBLICA 12-01-21 "PAVIMENTACION EN HORMIGON DOS CUADRAS EN M.I. VELA Y GARDEY (II ETAPA)  
y MEJORAMIENTO URBANO- CONSTRUCCION VEREDAS EN LA PLAZA M.I. VELA"

---

por falta de conocimientos técnicos del Contratista o sus empleados, será deshecho y reconstruido por el Contratista a su exclusiva cuenta a la primera intimación en ese sentido que le haga la Inspección, en el plazo que ésta fije.

El hecho de que no se hayan formulado en su oportunidad por la Inspección observaciones pertinentes por trabajos defectuosos o empleo de materiales de calidad inferior, no implica la aceptación de las mismas y la Inspección en cualquier momento en que el hecho se evidencie y hasta la Recepción Definitiva, podrá ordenar al Contratista su corrección, demolición o reemplazo siendo los gastos que se originan a cuenta de éste.

En todos los casos, si el Contratista se negara a la corrección, demolición o reemplazo de los trabajos rechazados, la Municipalidad podrá hacerlos por sí o por otros y a cuenta del Contratista y sin intervención judicial.

**ARTÍCULO 65: SUSPENSION DE LOS TRABAJOS:** En caso de suspensión de los trabajos en forma injustificada por parte del Contratista, se le aplicará una multa equivalente al cero coma uno por ciento (0,1%) del monto contractual, actualizado por cada día de suspensión.

**ARTÍCULO 66: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:** El Contratista será en todos los casos responsable de los daños y perjuicios ocasionados por la impericia de sus agentes u obreros, como así también de la mala fe, o falta de honestidad en el suministro o empleo de los materiales.

El Contratista responderá directamente a la Municipalidad o a terceros, de los daños producidos a las personas o a las cosas, con motivo de la ejecución de los trabajos, cualquiera sea su naturaleza, quedando entendido que sobre ello no tendrá derecho a pedir compensación alguna.

El Contratista debe tomar todas las disposiciones y precauciones para evitar daños al personal de la obra, a esta misma y a terceros, por acción de las máquinas y herramientas, por maniobra en el obrador, o por cualquier otra causa relacionada con la ejecución de la obra. El resarcimiento de los perjuicios que, no obstante, se produjeran, correrá por su exclusiva cuenta.

En ningún caso la Municipalidad será responsable de los daños y perjuicios emergentes de la ocupación temporaria de la propiedad privada hecha por el Contratista en su obrador o campamento.

El Contratista será directamente responsable por el uso indebido de materiales, sistemas de construcción, maquinarias o implementos patentados y pondrá a cubierto a la Municipalidad de todos los gastos y costos y de cualquier reclamo que pudiera originar el uso indebido de éstos. En caso de que esos reclamos prosperen, el Contratista deberá restituir a la Municipalidad todos los gastos y costos a que diera lugar, pudiendo hacerse efectivo de la Garantía de Contrato o de los créditos pendientes de cobro.

Asimismo el Contratista será responsable de los daños a los servicios públicos (gas, electricidad, sanitarios, etc.) cuando los mismos se realicen sin conocimiento y/o permiso de las entidades prestatarias de los servicios.

**ARTÍCULO 67: SUBCONTRATISTAS:** El Contratista podrá subcontratar con terceros parte de la obra adjudicada. Para hacerlo deberá obtener la previa conformidad de la Municipalidad.

Ninguna subcontratación autorizada eximirá al Contratista de su responsabilidad por el cumplimiento de las obligaciones emergentes del Contrato, la que se mantendrá como si las obras las hubiera ejecutado directamente. La Municipalidad no contrae ninguna obligación con los subcontratistas, aún autorizados.

**ARTÍCULO 68: PLAZO PARA RECLAMACIONES:** Las reclamaciones del Contratista, para cuya presentación no se establezcan expresamente plazos en otras partes de este Pliego, deberán ser interpuestas dentro de los cinco (5) días hábiles de producido el hecho que las motive, o de notificada la resolución de que se trate. Si no lo hiciera perderá todo derecho.

La reclamación podrá fundársela al tiempo de su presentación o hasta diez (10) días hábiles inmediatos siguientes, debiendo el Contratista, en éste último supuesto, hacer reserva expresa del derecho al momento de interponer la reclamación. En caso contrario, se dará por decaído este derecho.

**ARTÍCULO 69: PRÓRROGA DE PLAZOS:** Cuando el Contratista se exceda en la iniciación o terminación de la obra, se le podrá otorgar una prórroga, siempre que lo solicite expresamente y lo justifique en debida forma, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles de la producción del hecho o causa que la motive, transcurrido el cual no se tomará en consideración.

A los efectos del otorgamiento de dicha prórroga se tomarán en consideración, especialmente, las siguientes causas:

Encargo de trabajos adicionales imprevistos que demanden un mayor tiempo para la ejecución de las obras;

---

LICITACIÓN PÚBLICA 12-01-21 "PAVIMENTACION EN HORMIGON DOS CUADRAS EN M.I. VELA Y GARDEY (II ETAPA)  
y MEJORAMIENTO URBANO- CONSTRUCCION VEREDAS EN LA PLAZA M.I. VELA"

---

Demora comprobada en la entrega de planos complementarios o de instrucciones sobre dificultades técnicas imprevistas;

Casos fortuitos o de fuerza mayor producidos sin culpa del Contratista;

Dificultades insuperables para conseguir materiales;

Demoras imputables a otros contratistas, si los hubiera.

La Inspección estará obligada a sustanciar el pedido de prórroga de inmediato y la resolución respectiva podrá ser dictada al tiempo del vencimiento o del término establecido para la Recepción Provisoria, o de decidirse, la paralización de la obra.

Será autoridad competente para resolver la prórroga la Secretaría de Gobierno, o el Departamento Ejecutivo según la naturaleza o importancia de la prórroga.

Se define como "día de lluvia" el período de veinticuatro (24) horas utilizado por el Servicio Meteorológico Nacional como unidad de tiempo, al que se refiere su registro de lluvia diaria y durante el cual la precipitación supere los cinco milímetros. Por cada día de lluvia que se produzca en día hábil y que sobrepase el valor consignado precedentemente, se adicionará un día al plazo contractual, salvo que sus consecuencias determinen una real paralización de los trabajos en el o los días subsiguientes, en cuyo caso, a requerimiento de la empresa, la Inspección podrá propiciar la prórroga por los días que correspondan al motivo señalado. Igual procedimiento se seguirá en los casos en que se registren paralizaciones de los trabajos como consecuencia de días de lluvia correspondientes a días no laborables.

**ARTÍCULO 70: MODIFICACIONES Y ADICIONALES:** La Municipalidad podrá licitar o convenir al margen del contrato, sin que el Contratista tenga derecho a reclamación alguna, cualquier trabajo que no se haya pactado expresamente.

Además podrá ordenarse al Contratista la ejecución de modificaciones que produzcan aumentos o reducciones de costos, o trabajos adicionales que no exceden del veinte por ciento (20%) del monto total del Contrato, los que serán de realización obligatoria y se regirán por lo que disponga sobre la materia la Ley de Obras Públicas de la Provincia y su Reglamentación.

El decreto que al efecto se dicte, deberá contar además el aumento o disminución del plazo contractual, entendiéndose en caso contrario que el plazo no ha sido modificado.

**ARTÍCULO 71: LIQUIDACIÓN DE TRABAJOS SUPLEMENTARIOS Y NUEVOS PRECIOS UNITARIOS:**

A. Cuando las modificaciones o ampliaciones impliquen aumentos o reducciones de ítems contratados dentro de los límites establecidos en el Artículo anterior, se pagarán de acuerdo con los precios unitarios del Contrato;

B. Cuando las modificaciones o ampliaciones impliquen creación de nuevos ítems diversos a los contratados o trabajos adicionales no previstos en el Contrato, los nuevos precios se establecerán cuando sea posible, partiendo de los precios contractuales correspondientes a trabajos análogos o semejantes.

Tanto en ese caso, como si ello no fuera posible, en los nuevos precios se discriminarán los materiales, mano de obra, incidencia del equipo, gastos generales, beneficios y cualquier otro rubro que corresponda considerar según el caso. Los precios que así se determinen corresponderán a la fecha de licitación y sufrirán en su oportunidad el reconocimiento de mayores costos que corresponda. La creación de nuevos ítems deberá autorizarse mediante Decreto Municipal.

De no llegarse a un acuerdo previo sobre los nuevos precios, el Contratista deberá ejecutar inmediata y obligatoriamente los trabajos si así lo ordenase el Departamento Ejecutivo, dejando a salvo sus derechos mediante manifestación expresa. En este caso, se le reconocerá al Contratista el costo real a precios promedios de plaza u oficiales si estuvieran fijados, con la aprobación o reparos que le merezca a la Dirección, la que supervisará como elemento ilustrativo para fijar luego el precio en instancia administrativa, sin perjuicio de la ulterior vía judicial.

A todos los efectos de este apartado B, las partes aceptan el quince por ciento (15%) de gastos generales y el diez por ciento (10%) de beneficios.

**ARTÍCULO 72: FORMALIDADES PARA LA MEDICION DE LA OBRA:** El Pliego de Especificaciones Técnicas podrá determinar las formalidades y detalles del instrumento en que conste el resultado de la medición.

La medición se efectuará con la intervención de la Inspección de obra y el Representante Técnico del Contratista.

---

LICITACIÓN PÚBLICA 12-01-21 "PAVIMENTACION EN HORMIGON DOS CUADRAS EN M.I. VELA Y GARDEY (II ETAPA)  
y MEJORAMIENTO URBANO- CONSTRUCCION VEREDAS EN LA PLAZA M.I. VELA"

---

En caso de ausencia o disconformidad del Representante Técnico de la Empresa, se podrá extender de todas maneras el certificado de obra, con los resultados de la medición efectuada por la Inspección, pudiéndose con posterioridad, si correspondiere, realizar la rectificación inmediata, o diferir para la liquidación final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiere acuerdo.

En todos los casos se labrará un acta dejándose constancia de los elementos necesarios para la determinación de la obra realizada y se entregará copia de la misma al Contratista.

Cuando la medición de ciertas estructuras o partes de la obra puedan presentar dificultades, la operación se realizará en el momento que indique la Inspección, labrándose el acta correspondiente. Estas mediciones no darán origen a un certificado de obra, pero serán tenidas en cuenta al tiempo de efectuarse la certificación del período correspondiente.

**ARTÍCULO 73: CARACTER DE LOS CERTIFICADOS:** Todos los certificados constituirán documentos provisionales para pagos a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones hasta tanto se produzca la liquidación final de la obra, y ésta sea aprobada por la Municipalidad. Pero una vez extendidos no podrán ser modificados en sus montos, ni retenido su trámite de pago, salvo cesión o embargo de los derechos de cobro, notificados fehacientemente a la Municipalidad.

**ARTÍCULO 74: GARANTIA DE OBRA:** Del importe de cada certificado de obra, de mayores costos, ampliaciones o adicionales, se deducirá el cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparo.

Esta retención se afectará a las eventuales reparaciones de la obra a cargo del Contratista en el periodo de conservación que el mismo no hubiere efectuado en tiempo y forma. Su devolución en el importe no afectado se efectuará después de la Recepción Definitiva.

El contratista podrá solicitar la sustitución de esta retención acompañando Póliza de Caución por importe equivalente. La misma deberá constituir al garante en fiador principal pagador o codeudor solidario, con expresa renuncia a exigir interpelación prejudicial o judicial previa y al derecho de excusión, y mantenerse vigente durante todo el plazo de mantenimiento de obra. Las firmas deberán autenticarse por escribano público y, en caso de ser de jurisdicción ajena a la Provincia de Buenos Aires, legalizarse por el respectivo Colegio.

**ARTÍCULO 75: PAGO DE LAS OBRAS E INTERESES POR RETARDO:** El Municipio se compromete a realizar pagos en relación a la cantidad de obra ejecutada, a los 20 días de presentado el

correspondiente certificado mensual expedido por la contratista y aprobado por el área solicitante. Las obras se pagarán en cheque no a la orden, sobre la base de los certificados que presente el Contratista, una vez firmados por la Inspección y aprobados por las Autoridades Municipales.

El derecho a reclamo se extingue por el cobro de certificados realizados sin reserva ninguna, y la reclamación deberá siempre formularse por escrito para ser considerada.

**ARTÍCULO 76: CONSERVACION DE LA OBRA Y PLAZO DE GARANTIA:** Una vez recibida la obra provisoriamente y durante el plazo de garantía que se determina en el artículo 79, el Contratista será responsable de la conservación de las obras y de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos, así como de todos los trabajos que se requieran para mantenerle en buen estado de utilización conforme a su destino.

La responsabilidad del Contratista incluye la conservación hasta la Recepción Definitiva de la obra, de aquellas partes para las que se hayan efectuado Recepciones Parciales Provisorias.

Sólo se exceptúan de la obligación establecida los defectos resultantes de uso indebido de la obra.

Si se comprobare que el Contratista no cumple con la conservación permanente de la obra, se lo intimará formalmente para que así lo haga, dentro del plazo de diez (10) días hábiles desde la notificación, bajo apercibimiento de llevarse a cabo los trabajos necesarios por cuenta y cargo del Contratista.

Aun cuando se hubieren efectuado Recepciones Provisorias Parciales, el plazo de conservación de la obra se contará desde la fecha de la recepción total. Se considerará como fecha de Recepción Provisoria total, la fecha de la última Recepción Provisoria parcial, una vez concluida la obra y siempre que la naturaleza de la misma lo posibilite.

**ARTÍCULO 77: SEGURO DE OBRA:** La contratista deberá tomar los recaudos necesarios para evitar daños al Municipio y a terceros, siendo responsable por los accidentes que ocurran a obreros, propiedades o personas, ya sea por culpa del personal por él contratado o por causas eventuales relacionadas con la obra. Estará a su cargo la reparación, indemnización y/o responsabilidad de los daños producidos.

**ARTÍCULO 78: REDETERMINACIÓN DE PRECIOS:** Los precios del contrato derivado de la presente licitación podrán ser redeterminados a solicitud del contratista cuando los costos de los factores principales que los componen, reflejen una variación promedio ponderada superior al cinco por ciento (5%) y a solicitud del contratista, nunca lo serán de oficio por la Municipalidad.

---

LICITACIÓN PÚBLICA 12-01-21 "PAVIMENTACION EN HORMIGON DOS CUADRAS EN M.I. VELA Y GARDEY (II ETAPA)  
y MEJORAMIENTO URBANO- CONSTRUCCION VEREDAS EN LA PLAZA M.I. VELA"

---

Los precios se redeterminarán a partir del mes en que los costos de los factores principales que los componen superen lo normado en el párrafo anterior.

Los precios/índices de referencia a utilizar serán los informados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Los precios o índices de referencia a utilizar para la determinación de la variación de cada factor que integra los ítems del contrato, serán los aprobados al momento de la adjudicación.

Los montos por anticipos financieros o para acopio de materiales no estarán sujetos al régimen de redeterminación a partir de su efectivo pago.

Los adicionales y/o modificaciones de obra estarán sujetos al mismo régimen.

La suscripción del acta de redeterminación que finaliza el proceso de redeterminación de precios, implica la renuncia automática del contratista a todo reclamo por mayores costos, intereses, compensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza resultantes del proceso de redeterminación.

**ADECUACIONES PROVISORIAS:** la variación operada en la estructura de ponderación de insumos principales que proponga la Municipalidad, siempre que la misma supere el cinco por ciento (5%), se tomará como base para la adecuación de los precios del contrato, siempre que exista solicitud de redeterminación de precios por parte del contratista y que el contrato no se encuentre totalmente ejecutado. Esta adecuación tiene el carácter de provisoria y es a cuenta de lo que en más, o en menos, resulte de la redeterminación definitiva de precios.

La estructura de ponderación de insumos principales será informada en el momento de la adjudicación.

**ARTÍCULO 79: RECEPCION PROVISORIA:** La obra será recibida en forma provisoria una vez terminados todos los trabajos con arreglo al Contrato y efectuadas las pruebas que se establezcan en las Especificaciones, labrándose el Acta en presencia del Representante Técnico, la Contratista o los testigos presentes, en caso de que aquellos no concurran a la citación efectuada con cinco (5) días hábiles de anticipación.

Aun cuando las obras no se encuentren terminadas con arreglo al Contrato, y solo faltara subsanar ligeras deficiencias o completar detalles que no afecten la habilitación de las mismas, a juicio de la

Dirección Técnica, podrá realizarse la Recepción Provisoria, dejándose constancia de ello en el Acta respectiva, para lo cual la inspección de obra fijará un plazo en días, a los efectos de su correcta terminación dentro del plazo de conservación y garantía.

En el Acta que se debe labrar, se hará constar que los trabajos se efectuaron de acuerdo al contrato, de las modificaciones que se hayan autorizado, las multas, observaciones, penalidades, etc. a que se haga pasible la Contratista; la duración total de las obras terminadas y la fecha efectiva de terminación de los trabajos a partir de la cual correrá el plazo de garantía.

La Recepción Provisoria será una sola a la terminación total de los trabajos, aun cuando para su ejecución hubiera regido plazos parciales, salvo que la Dirección Técnica autorice recepciones parciales cuando así lo considere conveniente.

El plazo de conservación o garantía, se empezará a contar desde la fecha del Acta de Recepción Provisoria y en caso de haber existido Recepciones Provisorias Parciales, se tomará la fecha de la última.

**ARTÍCULO 80: RECEPCION DEFINITIVA:** Transcurridos trescientos sesenta y cinco (365) días corridos desde la Recepción Provisoria de la obra, salvo que la naturaleza de la obra haga indicar en el Pliego de Bases y Condiciones un plazo distinto, y presentados por el Contratista los certificados de conservación respectivos, podrá tener lugar la Recepción Definitiva, que se efectuará con las mismas formalidades que la provisoria, previa comprobación del buen estado de las obras y verificación del correcto funcionamiento de las Instalaciones especiales que hubiera, a cuyo efecto se harán las pruebas que la inspección estime necesarias.

La Recepción Definitiva no libera a la Contratista de la responsabilidad civil emergente del Código Civil y Comercial de la Nación.

**ARTÍCULO 81: DEVOLUCION DE FIANZA CONTRACTUAL:** La garantía de cumplimiento de Contrato o los saldos remanentes en su caso, le serán devueltos al Contratista dentro de los treinta (30) días corridos inmediatamente posteriores de aprobada la Recepción Provisoria de las obras por el Departamento Ejecutivo y una vez satisfecho las indemnizaciones por daños y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta.

En caso de admitirse Recepciones Parciales Definitivas, el Contratista tendrá derecho a que se le devuelva la parte proporcional de la garantía contractual.



**ARTÍCULO 82: DETERMINACION DE LAS MULTAS:** Los porcentajes abajo fijados, se refieren en todos los casos al monto de Contrato actualizado, con las mismas pautas de actualización que se adopten para los certificados de obra.

A los efectos de la aplicación de las multas se establecen los siguientes porcentajes:

Por cada día de demora en la presentación de la Garantía de Contrato: 0,1%.

Por cada día de retraso en la firma del Acta de Iniciación de Obra y Replanteo: 0,1%.

Por cada día de retraso en la iniciación de los trabajos: 0,1 %.

Por cada día de ausencia del Contratista en la Obra o del Representante Técnico: 0,1%.

Por cada día de demora en el retiro del material rechazado: 0,1 %.

Por cada día de demora en la entrega de la obra terminada, conforme al plazo establecido: 0,1 %.

Por cada día de paralización de la obra, por causas imputables al Contratista conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones: 0,1%.

Por incumplimiento en la disposición sobre Seguro Obrero (por cada día de demora en la entrega de la póliza): 0,1 %.

Por cada día de demora en la presentación de la documentación para la firma del Contrato: 0,1%.

Por cada falta de limpieza en la obra, colocación de vallas o tareas inherentes: 0,1 %.

Por cada día de demora en el cumplimiento de la Orden de Servicio: 0,1 %.

Por cada infracción a lo especificado en las Cláusulas Técnicas Legales y Administrativas del Pliego de Bases y Condiciones: 0,1 %.

Otros casos no previstos: 0,1 %

**ARTÍCULO 83: DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA DE OBRA:** La garantía de obra, o su remanente, será devuelta dentro de los treinta (30) días corridos de efectuada la Recepción Definitiva, sin actualización ni intereses.

**ARTÍCULO 84: RESCISION Y NOTIFICACIONES RECIPROCAS:** La rescisión del Contrato se ajustará en todos los casos, a lo establecido en la Ley 6021 y su Reglamentación.

La rescisión por culpa del Contratista será dispuesta por Decreto del Departamento Ejecutivo y comunicada por nota bajo recibo, telegrama colacionado o por cédula. Cuando fuera el Contratista quien rescindió, deberá comunicarlo por nota bajo recibo o telegrama colacionado indefectiblemente.

**ARTÍCULO 85: LIMPIEZA Y ARREGLO FINAL DE LA OBRA:** Una vez terminados los trabajos y previo a la medición final, el Contratista hará limpiar la obra y retirar de las zonas adyacentes, todo sobrante y desecho de materiales de cualquier especie, así como las construcciones provisorias.

**ARTÍCULO 86: CONTRATACION DE SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO:** La empresa adjudicataria de la obra deberá ajustarse a lo dispuesto en la Ley N° 24.557 de Riesgos de Trabajo y sus modificaciones, y en particular la Resolución N° 51/97 de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo para empresas constructoras, y en tal sentido deberá:

Presentar al momento de la firma del contrato, los datos del responsable del Servicio de Higiene y Seguridad de la Empresa, firmando en original por el Profesional.

A la firma del contrato la Empresa deberá presentar la comunicación de inicio de Obra a la A.R.T. y el Programa de Seguridad de acuerdo a la Resolución 51/97, presentado ante la A.R.T., que será girado junto con el pliego de obra, a la Secretaría de Gobierno para ser presentado al Depto. de Higiene y Seguridad de la Municipalidad de Tandil.

Al iniciar la obra se deberá dar cumplimiento a la Resolución 231/96 y presentar el listado del personal que intervendrá en la obra, conformado por la A.R.T. y el Programa de Seguridad aprobado por la A.R.T.

Periódicamente se presentarán las bajas y las altas del personal de la obra comunicadas a la A.R.T.

El Profesional responsable de Higiene y Seguridad de la Empresa deberá dejar constancia escrita de su presencia en la obra, como de las observaciones hechas en la misma.

Los Subcontratistas de diferentes especialidades, deberán cumplir con lo especificado en los puntos 2, 3 y 4, ya sea alcanzado por la Resolución 51/97 o por la Resolución 319/99 Art. 5°.

Toda persona de la Empresa, o Subcontratada por ésta que, por diferentes razones, no esté incluido en el listado de la A.R.T., deberá contar con un Seguro por Accidentes de Trabajo no colectivo. Esto será válido para el personal directivo de la Empresa que acceda a la obra, para los profesionales

---

LICITACIÓN PÚBLICA 12-01-21 "PAVIMENTACION EN HORMIGON DOS CUADRAS EN M.I. VELA Y GARDEY (II ETAPA)  
y MEJORAMIENTO URBANO- CONSTRUCCION VEREDAS EN LA PLAZA M.I. VELA"

---

contratados (que no se encuentren en relación de dependencia con la contratista, lo que alcanza al mismo Responsable de Higiene y Seguridad), y para los Subcontratistas, Empresas unipersonales y toda persona que por cualquier motivo se encuentre trabajando en la obra.

**ARTÍCULO 87: RESOLUCION DEL CONTRATO. REGLAS GENERALES:** La resolución del contrato se ajustará a lo dispuesto por la Ley 6.021 y su reglamentación y a lo previsto en este Pliego de Bases y Condiciones Legales. La resolución por culpa del Contratista será dispuesta por decreto del Departamento Ejecutivo y comunicada por nota bajo recibo, cédula de notificación, acta notarial, carta documento o telegrama colacionado.

**ARTÍCULO 88: RESOLUCION POR QUIEBRA, LIQUIDACION O CONCURSO PREVENTIVO:** La quiebra, la liquidación sin quiebra o el concurso de acreedores del adjudicatario producirán de pleno derecho la resolución del contrato.

Dentro de un plazo de sesenta (60) días, contados desde la fecha del auto de quiebra, de liquidación sin quiebra, o de declaración de concurso, podrá la Municipalidad aceptar que otra persona propuesta por sus acreedores o alguno de ellos, inscripta en la especialidad correspondiente del Registro de Proveedores, se haga cargo del contrato en iguales condiciones, siempre que tenga suficiente capacidad técnico- financiera para la ejecución del monto total de la obra y haga efectiva iguales garantías que el titular del contrato.

**ARTÍCULO 89: RESOLUCION POR INCAPACIDAD O MUERTE:** En caso de incapacidad o muerte del adjudicatario, la Municipalidad podrá resolver el contrato si dentro del plazo de noventa (90) días sus herederos o sus representantes legales, según corresponda, no la tomaren a su cargo ofreciendo las mismas garantías que las exigidas por el contrato, siempre que a juicio de la Municipalidad tuvieren o suplieren las condiciones necesarias de capacidad técnico financiera para cumplimiento del mismo.

También podrán, dentro de dicho término y en iguales condiciones, proponer a una de las firmas inscriptas en la especialidad correspondiente del Registro de Proveedores con la capacidad suficiente para el caso.

El mismo procedimiento podrá observarse cuando, adjudicada la obra, el adjudicatario falleciera o cayera en incapacidad antes de haberse firmado el contrato.

Si el Departamento Ejecutivo dispusiera la resolución por muerte o incapacidad del adjudicatario, abonará a la sucesión o al curador lo que se adeudare por los trabajos ejecutados y se le permitirá retirar el plantel, útiles y materiales. En este caso se devolverán los depósitos de garantía no afectados o sujetos a condición.

Si conviniera a la Municipalidad el plantel, los útiles y materiales acopiados para la obra, podrá arrendarlos o adquirirlos previa tasación efectuada por tres profesionales de la Comuna.

**ARTÍCULO 90: RESOLUCION POR CULPA DEL CONTRATISTA:** La Municipalidad tendrá derecho además a resolver el contrato en los siguientes casos:

- a) Cuando el adjudicatario se haga culpable de fraude o grave negligencia o contravenga las obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato;
- b) Cuando el adjudicatario se exceda sin causa justificada del plazo fijado en las bases de licitación, para la iniciación de las obras;
- c) Cuando el adjudicatario no llegare a justificar las demoras en la ejecución de la obra, en caso de que la parte ejecutada no corresponda al tiempo previsto en los planes de trabajos y a juicio de la Secretaria de Gobierno, no pueda terminarse la obra en los plazos estipulados;
- d) Cuando el adjudicatario infrinja las leyes del trabajo en forma reiterada;
- e) Cuando el total de las multas aplicadas alcance al 15% del monto del contrato. Previamente, en los caso b) y c) deberá intimarse al Adjudicatario por Orden de Servicio, cédula o telegrama colacionado dirigido al domicilio constituido, para que inicie o acelere los trabajos hasta alcanzar el nivel contractual de ejecución en el plazo que a tales efectos se le fije.

Vencido el plazo de intimación, e iniciadas las actuaciones tendientes a la resolución, la Dirección dispondrá por Orden de Servicio la paralización de los trabajos tomando la posesión de la obra, equipos y materiales, debiendo en la disposición respectiva fijar el plazo dentro del cual se formará inventario.

La comuna podrá disponer de los materiales perecederos con cargo de reintegro al crédito del adjudicatario.

**ARTÍCULO 91: EFECTOS DE LA RESOLUCION POR CULPA DEL CONTRATISTA:** Dispuesta la resolución del contrato por las causales contempladas en el artículo anterior, la misma tendrá las siguientes consecuencias:

---

*LICITACIÓN PÚBLICA 12-01-21 "PAVIMENTACION EN HORMIGON DOS CUADRAS EN M.I. VELA Y GARDEY (II ETAPA)  
y MEJORAMIENTO URBANO- CONSTRUCCION VEREDAS EN LA PLAZA M.I. VELA"*

---

El Contratista responderá por los perjuicios que sufra la Municipalidad a causa del nuevo contrato que celebre para la continuación de las obras o por la ejecución de estas por la administración.

La Municipalidad dispondrá, si lo cree conveniente (previa valuación), de los equipos y materiales que se encuentran en obra necesarios para la continuación de la misma.

Los créditos que resulten por los materiales, equipos e implementos que la Municipalidad reciba, en el caso del inciso anterior, por la liquidación de partes de obras terminadas y obras inconclusas que sean de recibo, quedarán retenidos a la resulta de la liquidación final de los trabajos ejecutados hasta el momento de la rescisión del contrato.

Sin perjuicio de las sanciones dispuestas en estas especificaciones, el adjudicatario incurso en fraude o grave negligencia perderá los depósitos de garantía. Asimismo se lo eliminará o suspenderá en el Registro de Proveedores de la comuna por el término que se fije y, en su caso, se comunicará al registro de licitadores del Ministerio de Obras Públicas.

Cuando se opere la rescisión por imperio de lo dispuesto en el inciso b) del artículo 90, el adjudicatario perderá el depósito de Garantía de Contrato.

En todos los casos en que la responsabilidad del adjudicatario excediera el monto de los depósitos de garantía podrá hacerse efectiva la misma sobre los equipos, los que se retendrán a este efecto, pudiendo afectarse créditos de la misma empresa con la Municipalidad.

En los casos en que surja responsabilidad técnica, el Departamento Ejecutivo dará traslado del hecho al Colegio de Ingeniería de la Provincia de Buenos Aires.

**ARTÍCULO 92: RESOLUCION POR CULPA DE LA MUNICIPALIDAD:** El Contratista tendrá derecho a solicitar la resolución del contrato en los siguientes casos:

- a) Cuando por causas imputables a la Municipalidad se suspenda por más de seis (6) meses la ejecución de las obras;
- b) Cuando el adjudicatario se vea obligado a reducir el ritmo previsto en más de un cincuenta por ciento (50%) durante cuatro (4) meses como consecuencia de la falta de cumplimiento de la Municipalidad en la entrega de la documentación, o elementos a que se hubiere comprometido, según contrato;

c) Cuando la Municipalidad no efectúe la entrega de terrenos, ni realice el replanteo cuando éste corresponda dentro del plazo fijado en el contrato, más una tolerancia de treinta (30) días, siempre que esta circunstancia impida la iniciación de la obra.

En todos los casos, el adjudicatario intimará previamente a la Municipalidad a normalizar la situación, la que deberá hacerlo en el plazo de sesenta (60) días para los casos de los incisos a) y b) y de quince (15) días para el caso del inciso c). Una vez que se expida la Municipalidad sin normalizar la situación, o transcurridos los plazos establecidos, el adjudicatario tendrá derecho a resolver el contrato, para lo cual se requerirá una nueva comunicación fehaciente por la cual así lo disponga.

**ARTÍCULO 93: EFECTOS DE LA RESCISION POR CULPA DE LA MUNICIPALIDAD:** Producida la resolución del contrato en virtud de las causales previstas en el artículo anterior, la misma tendrá las siguientes consecuencias:

- Liquidación a favor del adjudicatario del importe de los materiales acopiados y los destinados a obra, en viaje o en elaboración, que sean de recibo.
- Transferencias sin pérdida para el adjudicatario de los contratos celebrados por el mismo para la ejecución de la obra o indemnización.
- Si hubiere trabajos ejecutados, se efectuará la Recepción Provisional, debiendo realizarse la Definitiva una vez vencido el plazo de conservación fijado, cuando esta corresponda.
- Liquidación a favor del adjudicatario de los trabajos realizados a los precios de contrato.
- Liquidación a favor del adjudicatario de los gastos generales comprobados y beneficios correspondientes al monto de obra que ha dejado de ejecutar.
- No se liquidará a favor del adjudicatario suma alguna por otros conceptos que los especificados en este artículo. La Municipalidad en el término de noventa (90) días practicará las liquidaciones a que se refiere este artículo. El transcurso del plazo se suspenderá cuando el adjudicatario no adjuntare los elementos probatorios que obraren en su poder y que le fueran requeridos.

**ARTÍCULO 94: RESOLUCION POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:** Será asimismo causal de resolución el caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite el cumplimiento del contrato. En este caso se pagará al adjudicatario la obra que hubiera ejecutado conforme a las estipulaciones del contrato y los materiales acopiados que fueran de recibo, a los precios de contrato.

**ARTÍCULO 95: HALLAZGOS:** De acuerdo a la Ordenanza N° 7772/99, el Representante Técnico de la Empresa Contratista será responsable de informar de hallazgos arqueológicos, paleontológicos o históricos, conforme a los artículos de la Ordenanza precitada. En tal caso, la Empresa adjudicataria de

---

*LICITACIÓN PÚBLICA 12-01-21 "PAVIMENTACION EN HORMIGON DOS CUADRAS EN M.I. VELA Y GARDEY (II ETAPA)  
y MEJORAMIENTO URBANO- CONSTRUCCION VEREDAS EN LA PLAZA M.I. VELA"*

---

la obra quedará exenta del pago de multas por demoras en la ejecución de la obra. A tal fin, la Inspección de Obra certificará la tarea realizada hasta el momento del hallazgo y consecuentemente se paralizará la misma.

PLIEGO OFICIAL

## FORMULARIO FDCA 01

Declaraciones Juradas de aceptar jurisdicción y de no estar impedidos de participar:

Quien suscribe,....., en representación de ....., declaro bajo juramento aceptar la jurisdicción y competencia de los Tribunales del Departamento Judicial de Azul, ante cualquier cuestión judicial que se suscite.

Asimismo, para participar de este proceso licitatorio juro no encontrarme/nos:

- Quebrado/s ni concursado/s,
- Inhabilitado/s por condena judicial;
- Habiendo incumplido contratos suscritos con la Municipalidad de Tandil;
- Suspendido/s o inhabilitado/s en el Registro de Proveedores de la Municipalidad;
- En estado de inhibición general de Bienes;
- Con pedido de Concurso de Acreedores o de Quiebra en trámite;
- Desempeñando el carácter de funcionario/s, empleado/s, contratado/s o cualquier otra naturaleza de relación de empleo con el Estado en el orden nacional, provincial o municipal;

Licitación Pública:.....

Fecha:.....



## **CONSTITUCIÓN DE DOMICILIOS**

Domicilio legal:

Calle:.....N°.....Piso.....Dpto.....

Localidad:.....

Provincia:.....Código Postal:.....

Domicilio especial en el Partido de Tandil:

Calle:.....N°.....Piso.....Dpto.....

Domicilio electrónico (e-mail):.....

Se tomarán como válidos los domicilios denunciados en la presente a los efectos de cursar todas las notificaciones pertinentes posteriores a la celebración del acto de apertura del proceso licitatorio de referencia.

El oferente se compromete a comunicar fehacientemente cualquier modificación que se suscite en el transcurso del proceso. De lo contrario, no podrá alegar ni efectuar reclamo alguno por no haberse anunciado oportunamente.

**FORMULARIO DE LA PROPUESTA BÁSICA OBLIGATORIA**

Quien suscribe, \_\_\_\_\_ en  
representación de \_\_\_\_\_ con domicilio constituido en la calle  
\_\_\_\_\_ Nº \_\_\_\_\_ de la ciudad de Tandil, atento a lo dispuesto en el  
Código de Obras Públicas, habiendo examinado los Planos y el Pliego de Bases y Condiciones Legales  
de la obra: LICITACIÓN PÚBLICA 12-01-21 "PAVIMENTACION EN HORMIGON DOS CUADRAS EN  
M.I. VELA Y GARDEY (II ETAPA) Y MEJORAMIENTO URBANO-CONSTRUCCION DE VEREDAS EN  
PLAZA M.I.VELA ", cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de pesos trece millones novecientos  
cuarenta y dos mil quinientos cincuenta (\$13.942.550,00) habiendo recogido en el lugar los datos  
necesarios, se compromete a efectuar de conformidad a los lineamientos de la Memoria Descriptiva y  
el Pliego de Bases y Condiciones Legales los trabajos allí detallados, por la suma de pesos  
\_\_\_\_\_  
(\$.....)

Acompaña comprobante de garantía de oferta por el importe de pesos \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (\$.....).

Declara conocer todos los términos del legajo, el lugar y características donde se ejecutarán las obras,  
comprometiéndose a entregar lo solicitado según lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones.

FECHA:.....

LICITACIÓN PÚBLICA 12-01-21 "PAVIMENTACION EN HORMIGON DOS CUADRAS EN M.I. VELA Y GARDEY (II ETAPA)  
y MEJORAMIENTO URBANO- CONSTRUCCION VEREDAS EN LA PLAZA M.I. VELA"

## **FORMULARIO DE LA PROPUESTA**

### **ALTERNATIVA OPCIONAL**

#### **(Con 20% de anticipo para acopio de materiales)**

Quien suscribe \_\_\_\_\_ en  
representación de \_\_\_\_\_ con domicilio constituido en la calle  
\_\_\_\_\_ No \_\_\_\_\_ de la ciudad de Tandil, atento a lo dispuesto en el  
Código de Obras Públicas, habiendo examinado los Planos y el Pliego de Bases y Condiciones Legales  
de la obra: LICITACIÓN PÚBLICA 12-01-21 "PAVIMENTACION EN HORMIGON DOS CUADRAS EN  
M.I. VELA Y GARDEY (II ETAPA) y MEJORAMIENTO URBANO- CONSTRUCCION DE VEREDAS EN  
LA PLAZA DE M.I. VELA" , cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de pesos trece millones  
novecientos cuarenta y dos mil quinientos cincuenta (\$13.942.550,<sup>00</sup>) habiendo recogido en el lugar  
los datos necesarios, se compromete a efectuar de conformidad a los lineamientos de la Memoria  
Descriptiva y el Pliego de Bases y Condiciones Legales los trabajos allí detallados, por la suma de  
pesos.....

.....(\$.....)

solicitando un ANTICIPO FINANCIERO DEL VEINTE POR CIENTO (20%) equivalente a PESOS

\_\_\_\_\_  
(\$ \_\_\_\_\_); monto que será respaldado a través  
de:....., sujeto a aprobación por parte del Municipio.

## PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

CÓMPUTO				PRESUPUESTO		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	% DE INCI.D. SUGERIDO
<b>1</b>	<b>Pavimentación en hormigón</b>				<b>\$</b>	100%
1.1	MOVIMIENTO DE SUELOS incluye todo el movimiento de suelo desmonte, hasta el nivel de saneamiento de la sub rasante, incluido el saneamiento de ser necesario	m2	2361			
1.2	CONSTRUCCION DE BASE SUELO SELECCIONADO/ESTABILIZADO incluye todo el movimiento de materiales ,aporte del suelo seleccionado/estabilizado pétreo conforme a las características técnicas del Pliego	m2	2361			
1.3	PAVIMENTO EN HORMIGON SIMPLE: Preparación fina de cancha, sellado y compactación Colado del hormigón, curado, aserrado y tomado de junta Limpieza y recalce del pavimento con respaldo de cordones de ser necesario	m2	2361			
1.4	CRUCES DE AGUA Zanjeo, tendido de la cañería de cruce tapada de la cañería y cámaras para dejar las conexiones en reserva hasta el empalme Cruces de agua Ø 0,050	Cant.	20			
<b>2</b>	<b>Ejecución de veredas y rampas: Según detalle de especificaciones en el pliego y planos. Incluye todas las tareas previas y posteriores a la ejecución de las veredas</b>	m2	1631		<b>\$</b>	100%
	<b>TOTAL</b>				<b>\$</b>	100%


Son

pesos:



.....

.....


LICITACIÓN PÚBLICA 12-01-21 "PAVIMENTACION EN HORMIGON DOS CUADRAS EN M.I. VELA Y GARDEY (II ETAPA)  
y MEJORAMIENTO URBANO- CONSTRUCCION VEREDAS EN LA PLAZA M.I. VELA"

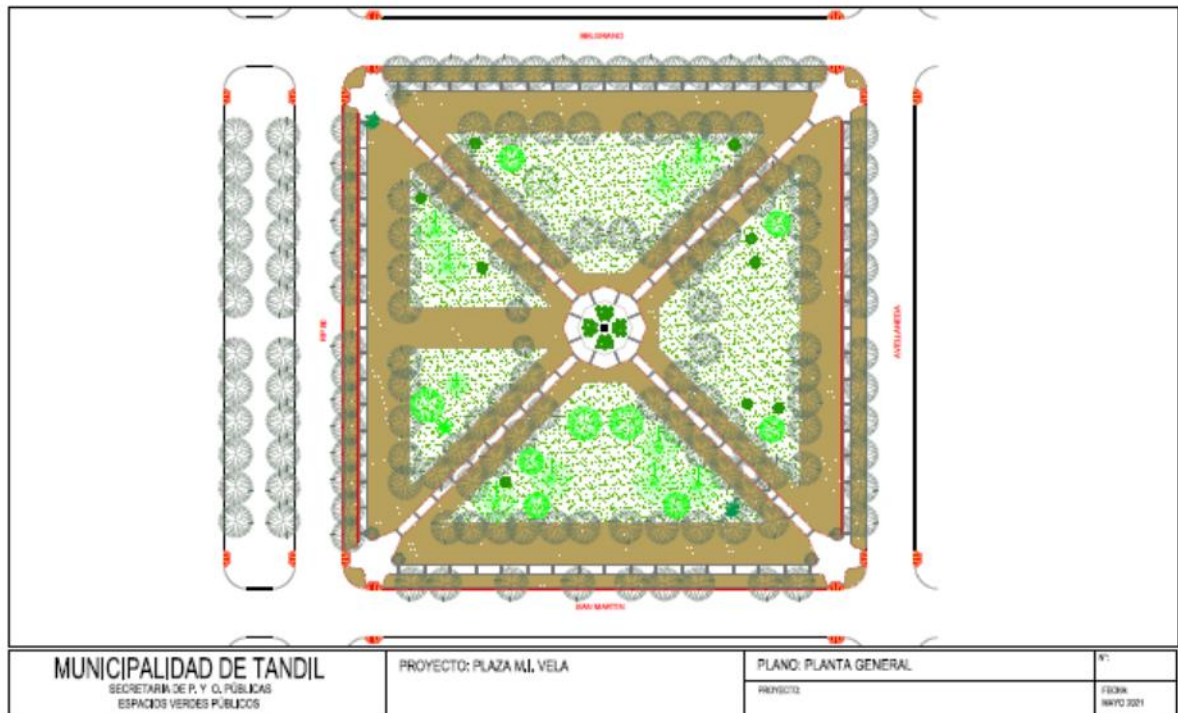


PLIEGO 01

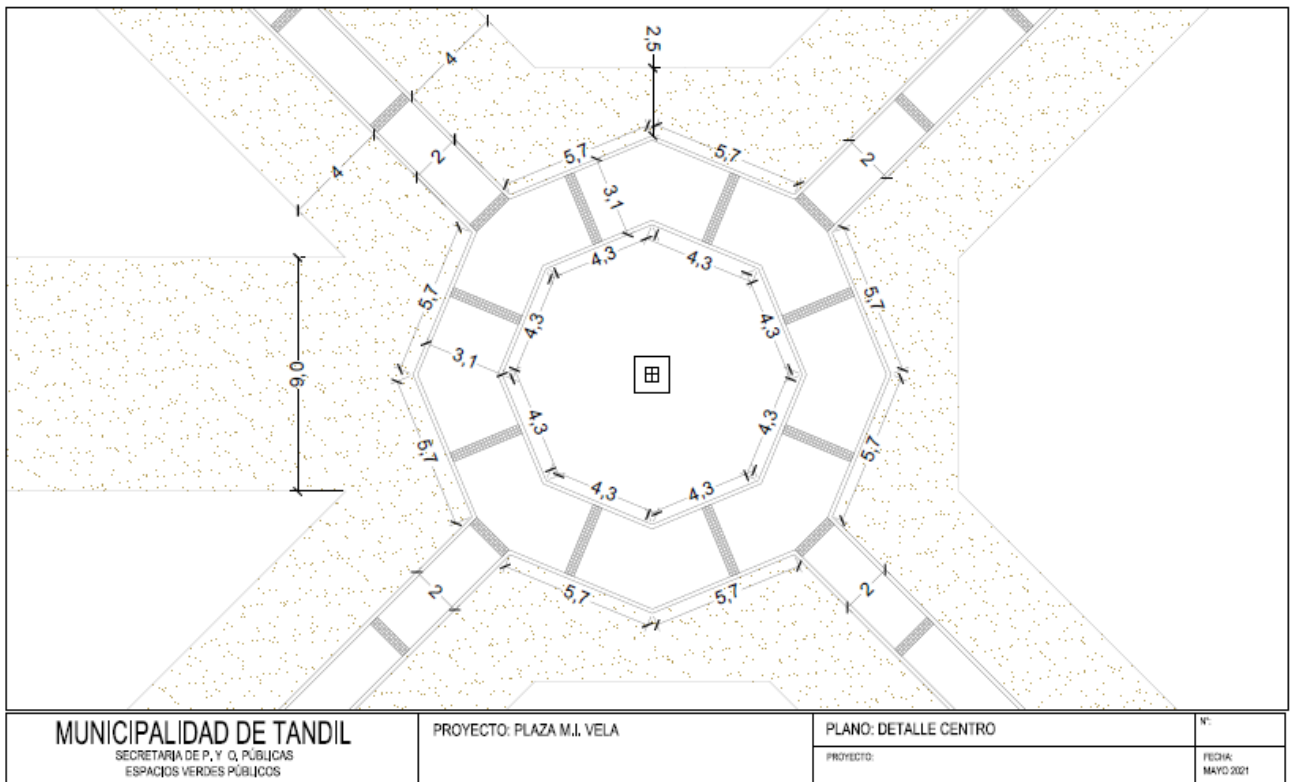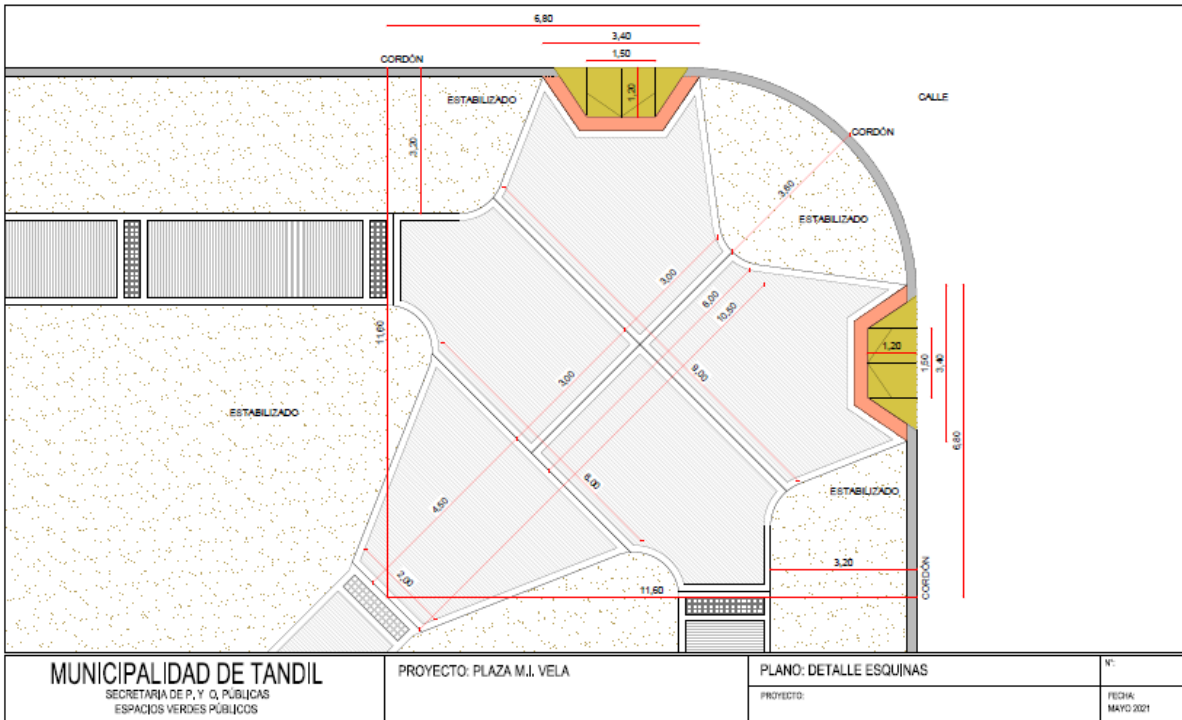

**LICITACIÓN PÚBLICA 12-01-21 "PAVIMENTACION EN HORMIGON DOS CUADRAS EN M.I. VELA Y GARDEY (II ETAPA)  
 y MEJORAMIENTO URBANO- CONSTRUCCION VEREDAS EN LA PLAZA M.I. VELA"**

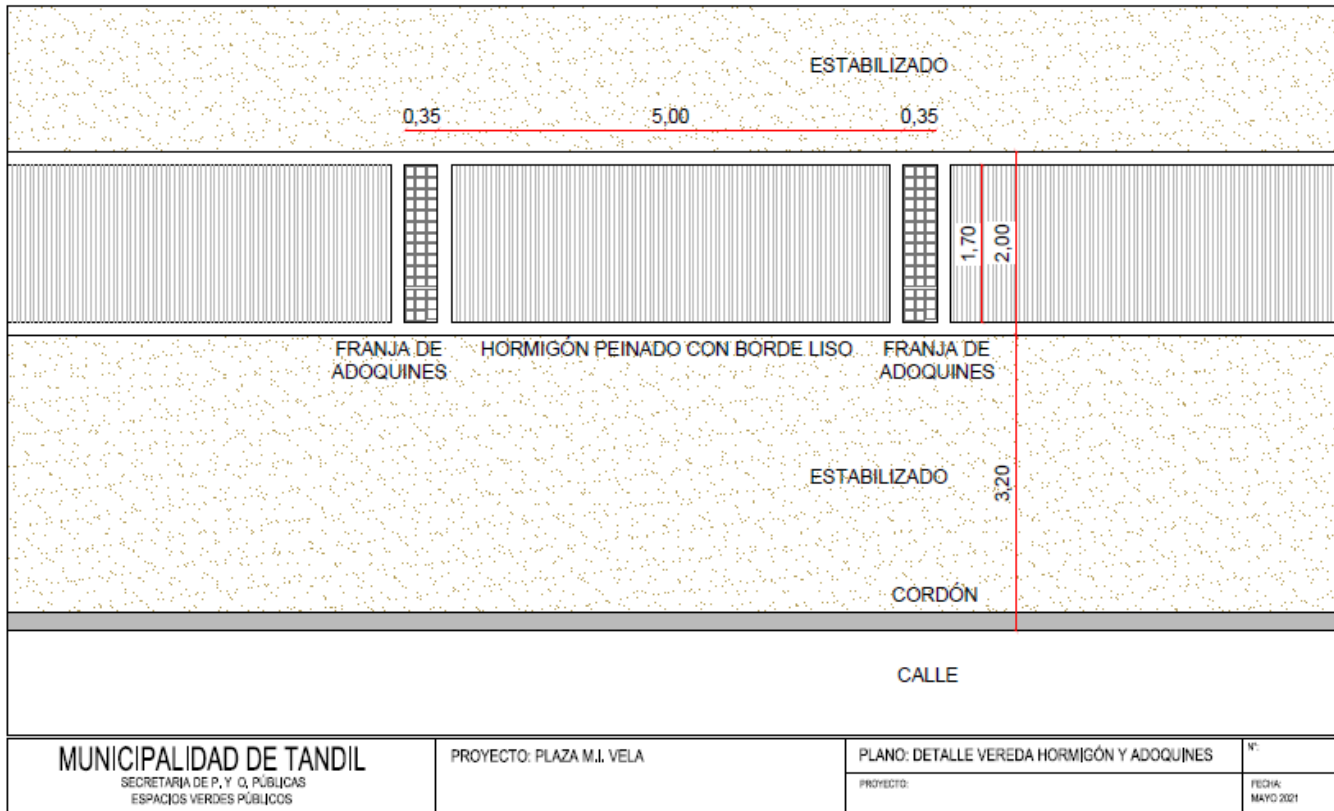

PLIEGO

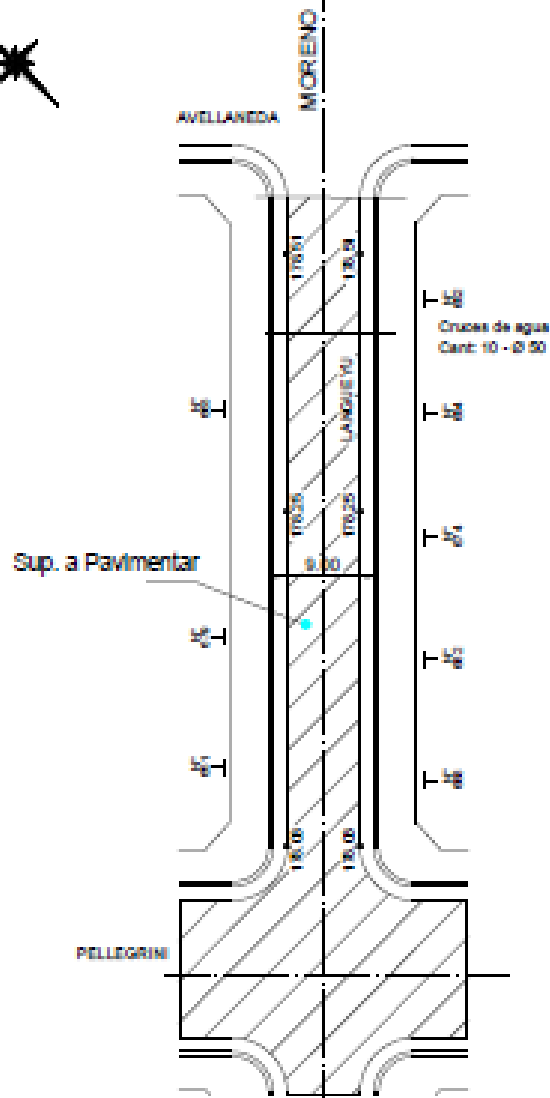

**Planimetrías**




**SECRETARIA DE PLANEAMIENTO Y OBRAS PUBLICAS**

*Dirección de Pavimentación y Obras de Desagües*

Director	Ing. Sergio F. Vergara	<b>OBRA</b> PAVIMENTACION UNA CUADRA      Loc. M.J.Vela PLANIMETRIA PROYECTO EN HORMIGON	Plano
Técnico	M.M.O. Walter O. Ríos		<b>004</b>
Fecha	27/05/2021		



LICITACIÓN PÚBLICA 12-01-21 "PAVIMENTACION EN HORMIGON DOS CUADRAS EN M.I. VELA Y GARDEY (II ETAPA)  
 y MEJORAMIENTO URBANO- CONSTRUCCION VEREDAS EN LA PLAZA M.I. VELA"

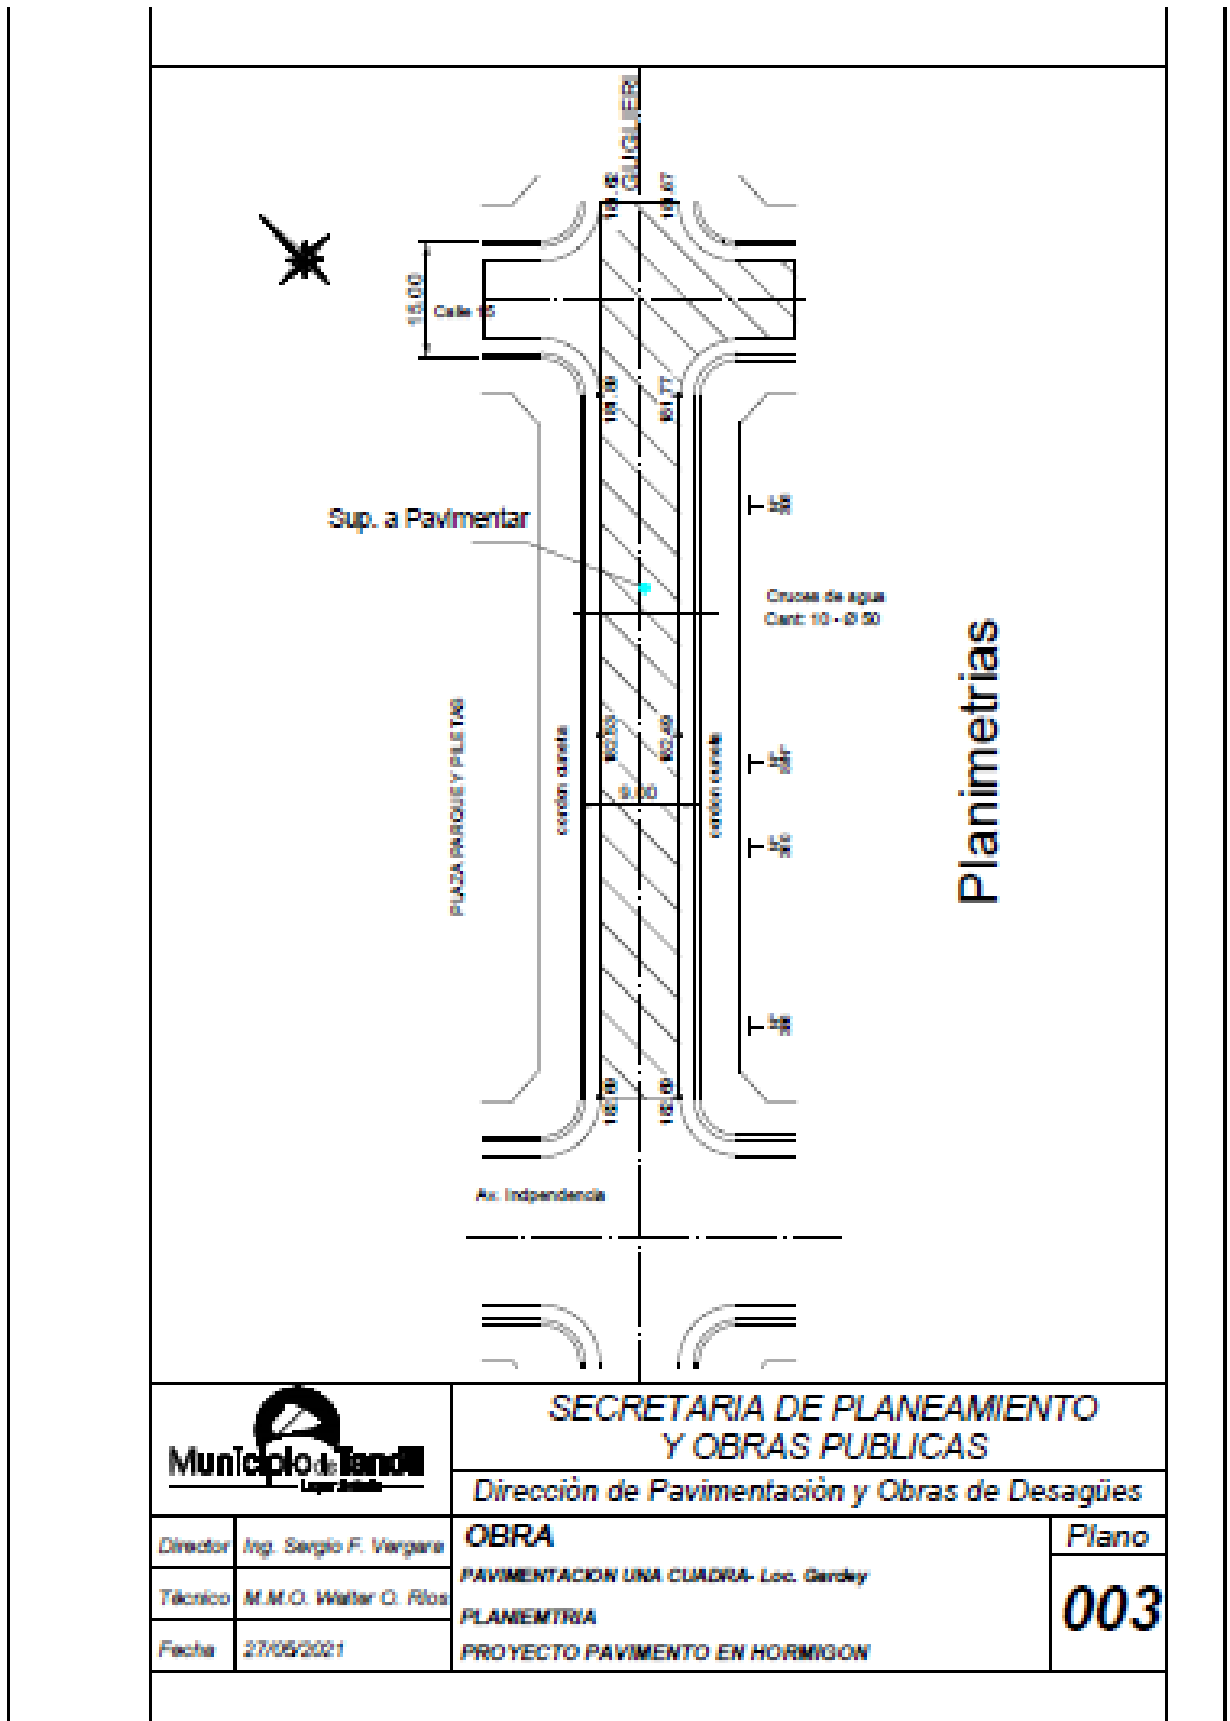



**Municipalidad de Tandil**  
2021

**Pliego**  
**Hoja Adicional de Firmas**

**Número:**

**Referencia:** Pliego con consideraciones de Secretaria de Obras Publicas, Licitación privada 12-01-2021 obra de pavimentación y en plaza de M.I. Vela y Gardey,, peticion desde Expediente Electrónico EX-2021-00038436- -MUNITAN-DCS#SEA

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 71 pagina/s.
